山亭区 2024 年农村公路养护工程项目

绩 效 评 价 报 告

鲁舜绩评字（2025）第 3701010 号

山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）

2025 年 12 月

山亭区 2024 年农村公路养护工程项目
绩效评价总览表

一、项目预算资金安排和使用情况		
项目名称：山亭区 2024 年农村公路养护工程项目		
主管部门：枣庄市山亭区交通运输局	实施单位：枣庄市山亭区交通运输局	
预算安排（万元）	238.38 万元	
其中：	财政资金	238.38 万元
实际到位金额（万元）	50 万元	
实际支出（万元）	50 万元	
二、项目绩效目标		
（一）绩效目标 1.总体目标 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以不断满足农村群众对美好出行的需求为宗旨，加快完善政府主导、多方参与的农村公路养护管理体系，提升养护效能，补齐管养短板，创新养护模式，为推进农业农村现代化、服务乡村振兴战略奠定坚实的交通基础，让农村出行更加安全便捷，让乡村发展更具活力，让党在农村的执政根基更加牢固。 2.具体目标 为提升公共服务管理水平、降低群众出行成本，将通过对路面缺陷责任期内损毁的安防设施进行修复，并持续完善农村公路养护工作，确保山亭区内公路整洁、安全、畅通，为群众创造更优的出行环境。 （二）主要指标 公路养护工程量完成情况、完工验收合格率、工程按合同规定时间完成的及时性、项目成本控制情况等。		
三、主要问题及相关建议		

（一）主要问题

1.财政资金保障力度不到位。

区财政局作为预算主管单位，资金拨付不及时，未能按合同约定执行付款。根据合同，工程完成审计后应支付至审计结算总额的97%，该项目审计后造价为233.47万元，而截至报告日，区财政仅拨付资金50万元。

2.制度执行有效性有待提高

核查发现，项目资金支付未严格遵循合同约定执行，同时，施工日志与监理日志等重要工程资料也未提供。

3.计划工程量与实际完成情况存在偏差

工程结算审核报告显示，部分项目的计划工程量与实际完成情况存在偏差。具体表现为，计划中的水泥混凝土路面（345m³）、铣刨水稳基层（380m³），以及厚180mm与160mm的水泥稳定土基层（分别为1400㎡与800㎡）等项目，在实际施工中均未予实施。

4.未按计划完成时间完工。

合同约定的计划工期为2024年7月11日至2024年12月31日，共计174日历天。而根据竣工验收记录，项目实际完成共耗时315日历天，实际工期较原计划有所延长。

5.道路养护量化指标缺乏执行追踪

该项目年初设定小修县道≥15条、养护乡道≥9条、养护村道≥17条的年度目标，但年底核查发现，相关责任人未统计实际完成情况，现有资料亦无明确记录，导致目标达成度无法验证。

6.后期巡护管理不规范，无台账记录可追溯

该项目未设专门后期维护监管制度，目前由下属交管所指派人员不定期巡护，发现问题通过微信上报位置，但全程无纸质巡护台账记录，执行情况缺乏书面追溯依据。

7.部分路段病害未及时处理

经现场群众反馈及评价小组实地核查发现，部分未纳入本次维修养护范围的路段，存在路面裂缝等病害问题，未能得到及时处置。

（二）相关建议

1.建议区财政局严格依据合同约定及审计结果，立即启动剩余款项拨付程序；同步明确财政资金拨付刚性时限，建立财政、审计、项目单位三方联动机制，强化信息共享与协同推进；同时将已审结项目纳入资金保障优先序列，简化审批流程、压缩办理周期，从源头上杜绝类似拖欠问题，切实维护合同严肃性与政府公信力。

2.严控资金支付，以合同节点、审计结果为依据，将施工日志、监理日志等关键资料作为支付审核必备条件，未齐备则暂停拨付；责成施工、监理单位限期补全缺失资料，逾期约谈负责人或扣款；建立财政、项目单位、监理三方核对机制，确保资料真实完整与支付进度匹配，杜绝违规支付与资料缺漏。

3.建议强化前期勘察与需求论证，通过现场勘察、历史数据比对精准把握项目需求与实施基础，杜绝盲目套模板的“纸上工程”，从源头提升计划科学性；同时建立动态跟踪机制，施工全程定期核验进度与计划偏差，对滞后或取消项目及时预警并调整资源配置，减少闲置浪费，确保资金效益与目标匹配。

4.建议强化全周期进度管控，以原计划为基准细化周/月关键节点目标，同步建立动态调整机制，对滞后环节及时预警并灵活调配资源，确保进度可控；深化前期风险研判，系统梳理本次延期主因（如施工受阻等问题），针对性制定预防措施；完善考核激励机制，将工期履约情况与合同款支付、评优评先直接挂钩，倒逼各方主动压实控期责任，多维度协同发力，切实提升项目管理精细化水平。

5.建议项目责任主体健全养护工作台账管理制度，对道路养护实施全过程痕迹化管理，及时准确统计各类道路养护完成数量并留存佐证资料，定期开展目标完成情况自查核验，确保年度既定目标可量化、可核查、可追溯，切实保障养护工作成效闭环管理。

6.建议健全项目后期常态化维护监管制度，规范道路巡护工作流程，明确专人专责落实常态化巡护要求，完善纸质巡护台账登记，详实记录巡护时间、路线、发现问题及处置情况等内容，替代仅通过微信上报的简易方式，形成闭环管理痕迹，确保巡护工作执行情况有据可查、有迹可溯，切实保障后期维护监管工作规范有效落地。

7.建议对辖区内非本次维修养护范围的道路开展全面排查，对排查发现的路面裂缝等病害问题，建立台账、制定计划、及时处置，切实保障群众出行安全。

四、评价得分和等级

一级指标	指标分值	得分	得分率（%）
决策	20	20.00	100.00%
过程	25	19.84	79.36%
产出	28	21.20	75.71%
效益	27	19.00	70.37%
合计	100	80.04	80.04%

绩效评价得分：80.04 分　　评价结果等级：良

目 录

一、项目基本情况 1
（一）项目概况 1
（二）项目绩效目标 2
二、绩效评价工作开展情况 3
（一）评价目的 3
（二）评价对象和范围 3
（三）评价指标体系 4
（四）评价方法 4
（五）绩效评价标准 4
三、评价结论及分析 5
（一）综合评价结论 5
（二）指标分析 6
1. 决策指标分析 6
2. 过程指标分析 9
3. 产出指标分析 12
4. 效益指标分析 21
四、发现的问题及原因分析 23
五、相关建议 25
六、其他需要说明的问题 27

山亭区 2024 年农村公路养护工程项目绩效评价报告

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

在当前全面推进乡村振兴的背景下，农村公路作为连接城乡、服务“三农”的重要基础设施，其养护工作具有突出的现实紧迫性和战略意义。山亭区部分农村公路因建成年代较早，随着交通量持续增长，已出现路面破损（如坑槽、裂缝）、路基沉降、排水系统堵塞等一系列问题，不仅影响村民日常安全便捷出行，也制约了农村经济的健康发展。与此同时，国家层面提出“四好农村公路”建设要求，山东省也专门出台《关于推进“四好农村公路”高质量发展的实施意见》，明确将农村公路高质量发展纳入乡村振兴整体布局。在此政策引导下，山亭区已将农村公路养护列为乡村振兴的重点任务加以推进。此外，周边村民对提升道路通行条件、改善出行环境的呼声日益强烈，形成了自下而上的现实需求。因此，当前加快农村公路养护工作，既是应对道路老化、保障通行安全的客观需要，也是落实国家与省级政策、响应群众期盼、服务乡村振兴战略的关键举措。

2.项目主要内容

山亭区 2024 年农村公路养护工程项目建设主要为修复性养护中的中修、预防性养护工程，道路等级:二级、三级、四级公路标准，全长:约 149 公里，主要建设内容为路基、路面维修、日常保洁等工程量清单范围内的所有施工内容。

3.项目实施情况

本项目主要实施内容包括路基挖填、路面铺筑、安全设施及预埋管线施工、路面清扫等。项目预算资金为 238.38 万元，经审定后的工程造价为 233.47 万元。截至评价报告日，已累计支付工程款 50.00 万元。

4.资金投入及使用情况

该项目预计投入 238.38 万元，根据工程造价审定金额为 233.47 万元，截至评价报告日，本项目共支付 50.00 万元，其资金支付明细如下:

表 1 山亭区 2024 年农村公路养护工程项目资金使用明细表

单位：元

序号	支出时间	金额
1	2025 年 09 月 29 日	400,000.00
2	2025 年 10 月 23 日	100,000.00
合计		**500,000.00**

（二）项目绩效目标

1.总体目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以不断满足农村群众对美好出行的需求为宗旨，加快完善政府主导、多方参与的农村公路养护管理体系，提升养护效能，补齐管养短板，创新养护模式，为推进农业农村现代化、服务乡村振兴战略奠定坚实的交通基础，让农村出行更加安全便捷，让乡村发展更具活力，让党在农村的执政根基更加牢固。

2.年度目标

为提升公共服务管理水平、降低群众出行成本，将通过对路面缺陷责任期内损毁的安防设施进行修复，并持续完善农村公路养护工作，确保山亭区内公路整洁、安全、畅通，为群众创造更优质的出行环境。

二、绩效评价工作开展情况

（一）评价目的

为更好地发挥财政资金效益，通过全面了解“山亭区 2024 年农村公路养护工程”项目预算资金的具体使用情况、执行情况、使用效果以及预期目标的实现程度，发现并分析项目在资金管理和项目管理中存在的问题，提出有针对性的建议，为进一步提高资金使用效率和效益、提高项目管理水平提供相应建议。

（二）评价对象和范围

评价对象为“山亭区2024年农村公路养护工程”项目资金使用情况；评价范围为“山亭区2024年农村公路养护工程”项目开展情况和项目的数量、质量、时效、成本等绩效目标的实现情况。

（三）评价指标体系

本次绩效评价指标总标准分值为100分，包括决策、过程、产出、效益四个一级指标，项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益十个二级指标、二十个三级指标。

（四）评价方法

本次评价严格遵循科学规范、公开公正原则，从多层面多维度进行综合分析，主要采用成本效益分析法、比较法、最低成本法和公众评判法等方法，以现场评价的方式进行分类、整理和分析；对评价的重点、难点和疑点问题，组织相关人员进行会审，在此基础上形成评价结论。

（五）绩效评价标准

本次绩效评价级次分为4个等级：综合得分在90分（含90分）以上为“优”；综合得分在80—90分（含80分）为“良”；综合得分在60—80分（含60分）为“中”：综合得分在60分以下为“差”，其中“优”表示成效显著，“良”表示成效明显，“中”表示成效一般，“差”表示成效较差。


三、评价结论及分析

（一）综合评价结论

该项目绩效评价得分为 80.04 分，评价结果为“良”。其中：项目决策类指标权重为 20 分，得分为 20 分；项目过程类指标权重为 25 分，得分为 19.84 分；项目产出类指标权重为 28 分，得分为 21.20 分；项目效益类指标权重为 27 分，得分为 19 分。详见下表：

表 2 山亭区 2024 年农村公路养护工程绩效评价得分情况表

一级指标	指标分值	得分	得分率%
决策	20	20.00	100.00
过程	25	19.84	79.36
产出	28	21.20	75.71
效益	27	19.00	70.37
合计	100	80.04	80.04

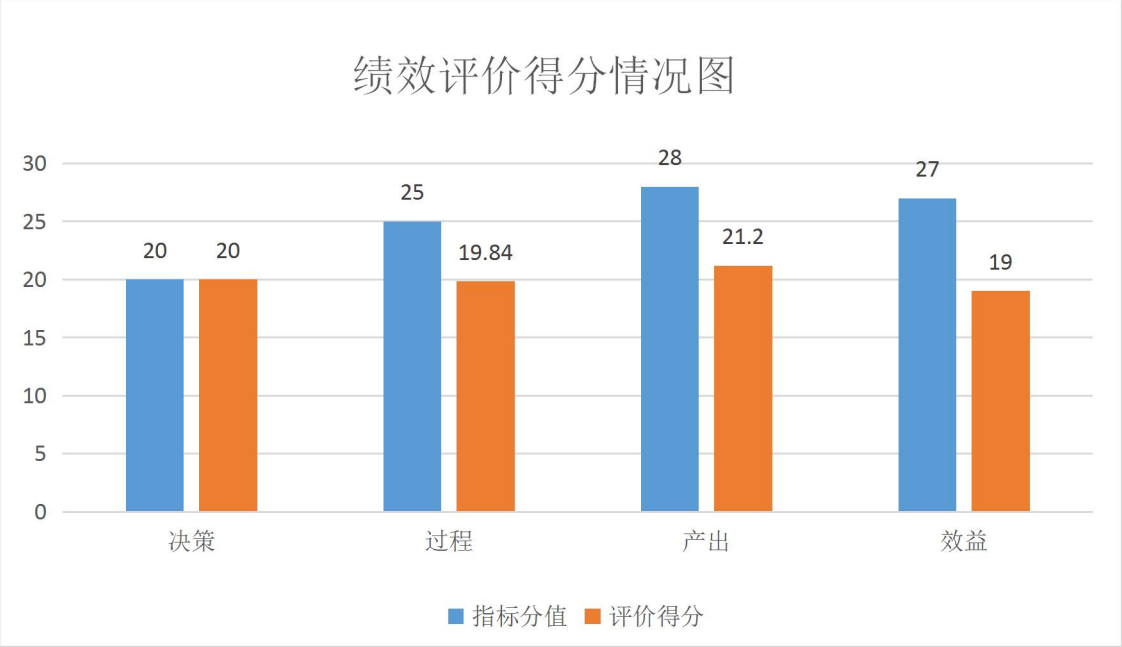


（二）指标分析

1. 决策指标分析

表 3　决策类指标评分结果

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
决策（20 分）	项目立项（6 分）	立项依据充分性	4	4
		立项程序规范性	2	2
	绩效目标（6 分）	绩效目标合理性	3	3
		绩效指标明确性	3	3
	资金投入（8 分）	预算编制科学性	4	4
		资金分配合理性	4	4

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
合　计			20	20

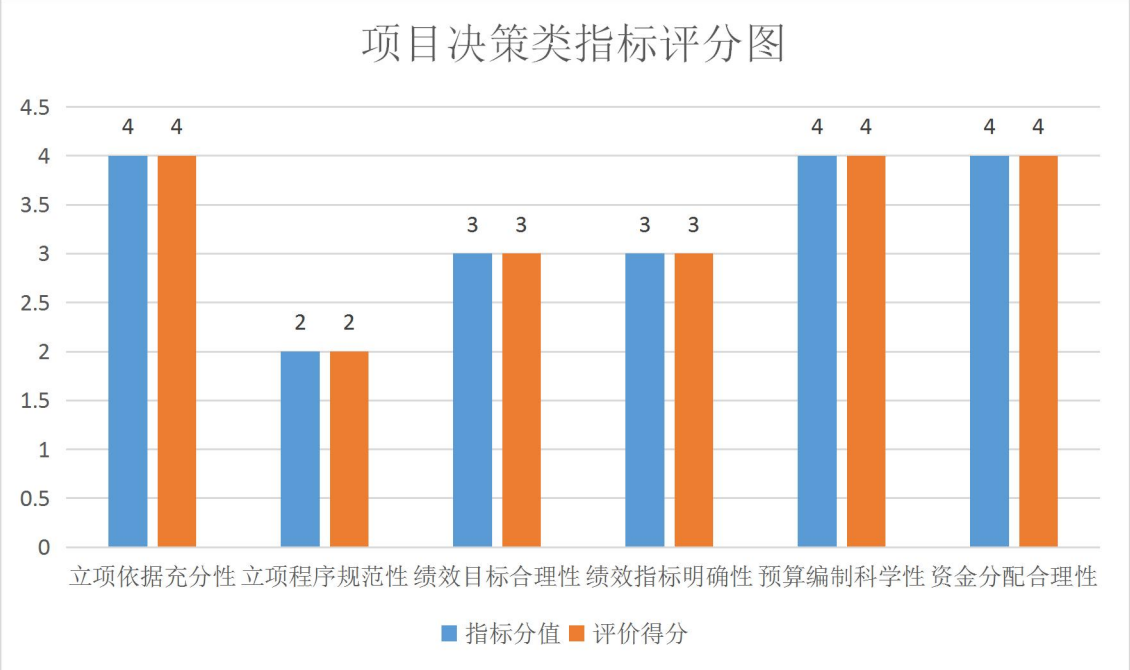

（1）项目立项

①立项依据充分性

经了解，该项目属于山亭区交通运输局的日常管理范畴。依据《国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见》（国办发〔2019〕45 号）、《农村公路养护管理办法》（中华人民共和国交通运输部令 2015 年第 22 号）、《农村公路建设管理办法》（中华人民共和国交通部令 2006 年第 3 号）、《关于印发枣庄市农村公路管理养护实施细则（试行）的通知》（枣交字〔2007〕147 号）等相关文件，组织实施了本项目。项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划及相关政策要求，

属于单位职责范围，纳入公共财政支持范畴，且未与同类或相关项目重复。

此项分值 4.00 分，评价得分为 4.00 分。

②立项程序规范性

2024 年 4 月 9 日，山亭区交通运输局向区政府报送了《关于山亭区 2024 年农村公路养护工程投资评审的请示》（山交便字〔2024〕12 号）。经区政府批准后，区财政局于 2024 年 4 月 19 日完成评审，并下达了《关于山亭区财政投资项目评审及招标说明》（山财投〔2024〕27 号）。该项目按程序申请报批，符合相关政策及规定要求。

此项分值 2.00 分，评价得分为 2.00 分。

（2）绩效目标

①绩效目标合理性

根据评价小组收集的相关资料显示，被评价单位提供了绩效目标申报表，项目整体绩效目标预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与实际工作内容相关性较强，与预算确定的项目投资额相匹配。

此项分值 3.00 分，评价得分为 3.00 分。

②绩效指标明确性

根据评价小组收集的相关资料显示，所设定的绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划。项目绩效目标与项

目实施单位即枣庄市山亭区交通运输局的职责密切相关，项目预期产出效益和效果符合正常业绩水平。

此项分值3.00分，评价得分为3.00分。

（3）资金投入

①预算编制科学性

山亭区交通运输局严格遵循预算管理规范，由工程部牵头编制项目工程量清单，经梳理核对后报送财务部门；财务部门对清单内容进行系统性汇总整理，结合项目实际需求统筹编制预算方案并按程序上报，确保预算内容与项目实际建设内容精准匹配。

此项分值4.00分，评价得分为4.00分。

②资金分配合理性


山亭区财政局依据山东山威项目管理有限公司出具的《山亭区2024年农村公路养护工程评审控制价的审核报告》（鲁山威造审字〔2024〕第064号），向山亭区交通运输局下达了该项目的招标控制价。交通运输局据此开展招标工作，整个资金分配依据充分、额度合理，与项目实际需求相适应，确保了资金使用的规范性和有效性。

此项分值4.00分，评价得分为4.00分。

2.过程指标分析

表 4　过程类指标评分结果

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
过程（25 分）	资金管理（12 分）	资金到位率	4	0.84
		预算执行率	4	4
		资金使用合规性	4	4
	组织实施（13 分）	管理制度健全性	4	4
		制度执行有效性	5	3
		信息公开程度	4	4
合　计			25	19.84

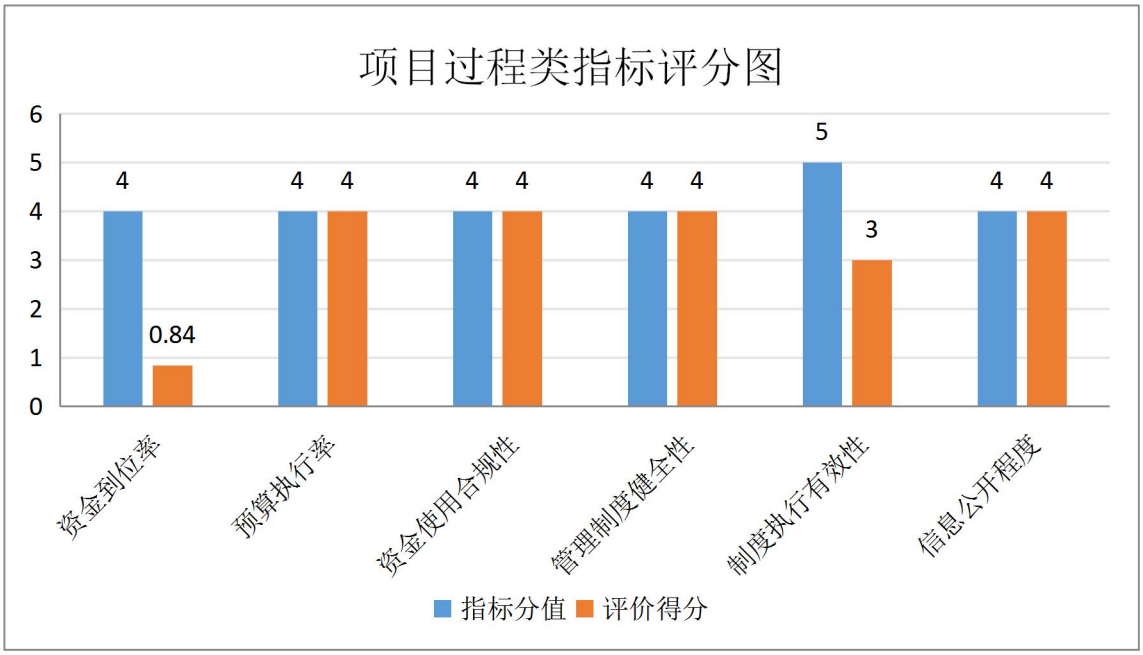

（1）资金管理

①资金到位率

根据评价小组收集的相关财务资料显示，本次绩效评价项目财政预算资金共计 238.38 万元，实际到位资金 50.00 万元，

资金到位率为 20.97%，根据评分标准，此项扣 3.16 分。

此项分值 4.00 分，评价得分为 0.84 分。

②预算执行率

根据评价小组收集的项目相关记账凭证及原始凭证等财务资料显示，截至评价报告日，山亭区交通运输局共收到财政资金 50.00 万元，并已全部支出，预算执行率为 100%。

此项分值 4.00 分，评价得分为 4.00 分。

③资金使用合规性

经与主管单位相关人员沟通核实，该项目资金申请遵循年初编制的预算，通过预算一体化系统向财政局提报；资金使用符合国家财经法规、财务管理制度及相关专项资金管理办法要求，不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等违规情形；资金用途均与项目预算批复内容及合同约定保持一致，且所有资金拨付环节均履行了规范的审批程序与手续。

此项分值 4.00 分，评价得分为 4.00 分。

（2）组织实施

①管理制度健全性

根据评价小组收集的相关资料显示，山亭区交通运输局结合实际工作需要，制定了《财务管理制度》《建设项目管理制度》及《档案管理规定》等各项内部管理制度。这些制度内容完整，且均符合国家相关法律法规与政策要求，整体上达到了

合法、合规、体系健全的标准。

此项分值 4.00 分，评价得分为 4.00 分。

②制度执行有效性

根据评价小组查阅的项目相关管理办法、制度等资料显示，该项目总体上能够依据相关文件制度执行，程序较为合规完善，但也发现存在部分问题：资金支付未完全按照合同约定流程执行，且缺少施工日志、监理日志等资料。根据评分标准，此项扣 2.00 分。

此项分值 5.00 分，评价得分为 3.00 分。

③信息公开及时性

经查询相关信息公开平台，该项目的实施进展及预算执行情况均已按要求及时对外公示。


此项分值 4.00 分，评价得分为 4.00 分。

3.产出指标分析

表 5　产出类指标评分结果

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
产出（28 分）	产出数量（7 分）	工程量完成情况	7	3.20
	产出质量（7 分）	完工验收合格率	7	7
	产出时效（7 分）	工程完成及时性	7	4
	产出成本（7 分）	项目成本控制情况	7	7

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
合　计			28	21.20

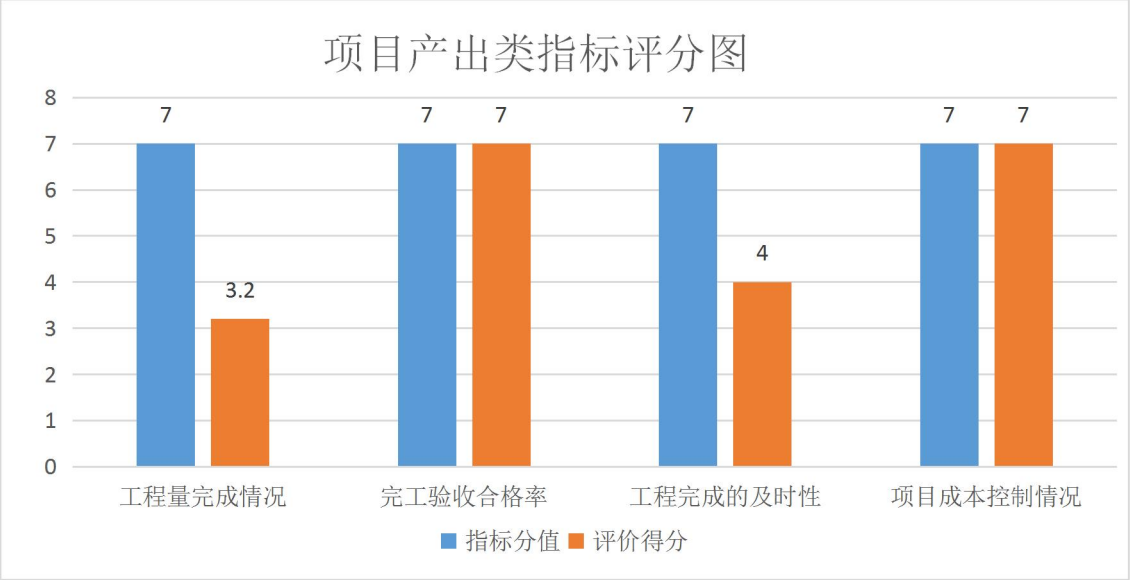

（1）项目产出

①工程量完成率

通过查看该项目的工程量清单及结算审核报告，项目原计划实施水泥混凝土路面、铣刨沥青面层、路基填方等路基工程，透层、细粒式沥青混凝土、培土路肩等路面工程，混凝土护栏刷反光漆、单柱式交通标志、道口标注等安全设施及预埋管线工程，以及路面障碍物清理与日常清扫等其他工程。审核结果显示，部分工程的实际完成工程量与原计划工程量存在不一致的情况，具体差异详见下表。根据评分标准，此项扣 3.80 分。

此项分值 7.00 分，评价得分为 3.20 分。

表 6　工程结算情况表

单位金额：元

名称	子目号	子目名称	单位	合同价			实际完成工程量及金额		
				数量	单价	合价	数量	单价	合价
总则	102-3	安全生产费(1.5%)	总额	1.00	34,580.90	34,580.90	1.00	34,580.90	34,580.90
合计						**34,580.90**			**34,580.90**
路基	202-2	挖除旧路面							
	202-2-a	水泥混凝土路面	m^3	345.00	65.60	22,632.00			
	202-2-b	铣刨沥青面层	m^3	135.00	52.00	7,020.00	302.89	52.00	15,750.13
	202-2-c	铣刨水稳基层	m^3	380.00	55.00	20,900.00			
	203-1-a	路基挖方	m^3	400.00	14.00	5,600.00			
	204-1-d	路基填方	m^3	800.00	34.00	27,200.00	1,740.71	34.00	59,184.23
	207-2-a	排水沟	m	300.00	708.00	212,400.00			
	207-10-b	排水管	m	80.00	850.00	68,000.00	11.00	850.00	9,350.00

名称	子日号	子目名称	单位	合同价			实际完成工程量及金额		
				数量	单价	合价	数量	单价	合价
	增项	圆管涵	m				14.00	3,000.00	42,000.00
	208-3-a	浆砌石护坡	m^3	60.00	630.00	37,800.00			
	209-1	砌体挡土墙							
	209-1-a	浆砌石挡土墙	m^3	120.00	525.00	63,000.00			
	209-1-e	砌石挡土墙勾缝	m^2	210.00	40.00	8,400.00			
	209-2	干砌挡土墙							
	209-2-a	干砌块石挡土墙	m^3	400.00	360.00	144,000.00			
	209-5	混凝土挡土墙							
	209-5-a	C25 片石砼挡土墙	m^3	20.00	820.00	16,400.00			
合计						**633,352.00**			**126,284.35**
路面	304-3	水泥稳定土基层							
	304-3-a	厚 180mm	m^2	1,400.00	81.00	113,400.00			

名称	子日号	子目名称	单位	合同价			实际完成工程量及金额		
				数量	单价	合价	数量	单价	合价
	304-3-b	厚 160mm	㎡	800.00	72.00	57,600.00			
	308-1	透层	㎡	2,500.00	6.50	16,250.00	4,985.49	6.50	32,405.69
	309-1	细粒式沥青混凝土							
	309-1-a	厚 50mm	㎡	2,000.00	75.00	150,000.00	2,258.85	75.00	169,413.75
	309-1-b	厚 70mm	㎡	500.00	105.00	52,500.00	3,570.60	105.00	374,913.00
	310-1	热沥青灌缝	m	400.00	16.00	6,400.00			
	310-2	沥青路面裂缝贴缝带	m	400.00	21.00	8,400.00			
	312-1	水泥混凝土面板							
	312-1-a	厚 150mm(C25 混凝土)	㎡	800.00	82.50	66,000.00	26.83	82.50	2,213.06
	312-1-b	厚 200mm(C25 混凝土)	㎡	600.00	110.00	66,000.00	306.00	110.00	33,660.00
	312-1-c	厚 350mm(C25 混凝土)	㎡	300.00	157.50	47,250.00	35.00	157.50	5,512.50

名称	子日号	子目名称	单位	合同价			实际完成工程量及金额		
				数量	单价	合价	数量	单价	合价
	313-1	培土路肩	m^3	500.00	38.00	19,000.00	520.00	38.00	19,760.00
	313-3	现浇混凝土加固土路肩	m^2	800.00	75.00	60,000.00			
合计						**662,800.00**			**637,878.00**
安全设施及预埋管线	602-1	混凝土护栏							
	602-1-a	混凝土护栏刷反光漆	m^2	150.00	45.60	6,840.00	666.13	45.60	30,375.53
	602-3	波形梁钢护栏							
	602-3-a	单面波形梁钢护栏	m	300.00	302.20	90,660.00	112.00	302.20	33,846.40
	增项	单面波形梁钢护栏喷漆	m				1,696.00	50.00	84,800.00
	604-1	单柱式交通标志							
	604-1-a	单柱式交通标牌(单面△、○)	个	4.00	2,320.00	9,280.00	14.00	2,320.00	32,480.00
	604-1-b	单柱式交通标牌(单面口)	个	4.00	2,760.00	11,040.00	6.00	2,760.00	16,560.00

名称	子日号	子目名称	单位	合同价			实际完成工程量及金额		
				数量	单价	合价	数量	单价	合价
	604-1-c	单柱式交通标牌(双面)	个	4.00	3,450.00	13,800.00			
	604-2	双柱式交通标志	个	4.00	3,480.00	13,920.00			
	604-3	柱式交通标志(迁移利用)	个	10.00	1,280.00	12,800.00	11.00	1,280.00	14,080.00
	604-5	悬臂式交通标志	个	1.00	10,500.00	10,500.00			
	604-12	道口标柱	个	40.00	240.00	9,600.00	60.00	240.00	14,400.00
	604-13	凸面镜	个	2.00	900.00	1,800.00	6.00	900.00	5,400.00
	605	道路交通标线							
	605-1	热熔型涂料路面标线	㎡	800.00	46.80	37,440.00	650.55	46.80	30,445.58
	605-2	溶剂常温涂料路面标线	㎡	2,800.00	23.50	65,800.00	23,591.62	23.50	554,403.07
	605-3	减速带震荡标线	㎡	200.00	146.50	29,300.00	293.72	146.50	43,029.25
合计						**312,780.00**			**859,819.83**

名称	子日号	子目名称	单位	合同价			实际完成工程量及金额		
				数量	单价	合价	数量	单价	合价
其他工程	801	农村公路日常巡查养护							
	801-1	路面微小障碍物清理及日常清扫							
	801-1-a	路面宽度 5m-7.5m	㎡	675,118.00	0.60	405,070.80	626,814.00	0.60	376,088.40
	801-1-b	路面宽度 7.5m-10m	㎡	416,272.00	0.70	291,390.40	387,850.00	0.70	271,495.00
合计						**696,461.20**			**647,583.40**
人工	102	普通工	工日	320.00	130.00	41,600.00	220.00	130.00	28,600.00
合计						**41,600.00**			**28,600.00**
总合计						**2,381,574.10**			**2,334,746.48**

（2）产出质量

①完工验收合格率

根据公路工程交（竣）工验收证书显示，该项目于2025年5月22日，由施工单位枣庄市顺达公路工程有限公司、监理单位枣庄翼云工程建设监理有限公司及项目法人单位枣庄市山亭区交通运输局三方共同组织验收，经验收认定为合格。

此项分值7.00分，评价得分为7.00分。

（3）产出时效

①工程完成的及时性

通过查阅该项目签订的合同与公路工程交（竣）工验收证书，合同约定的计划工期为2024年7月11日至2024年12月31日，共计174日历天。而根据竣工验收记录，项目实际完成共耗时315日历天，实际工期较原计划有所延长，根据评分标准，此项扣3.00分。

此项分值7.00分，评价得分为4.00分。

（4）产出成本

①项目成本控制情况


该项目年初计划成本为246.00万元，经财政评审后，预算成本调整为238.38万元。根据最终出具的工程项目结算审核报告，该项目核定成本为233.47万元，未超过其审定预算。

此项分值7.00分，评价得分为7.00分。

4. 效益指标分析

表 7　项目效益类指标评分结果

一级指标	二级指标	三级指标	分值	得分
效益（27 分）	项目效益（27 分）	社会效益	10	8
		生态效益	5	3
		可持续影响	6	4
		满意程度	6	4
合　计			27	19

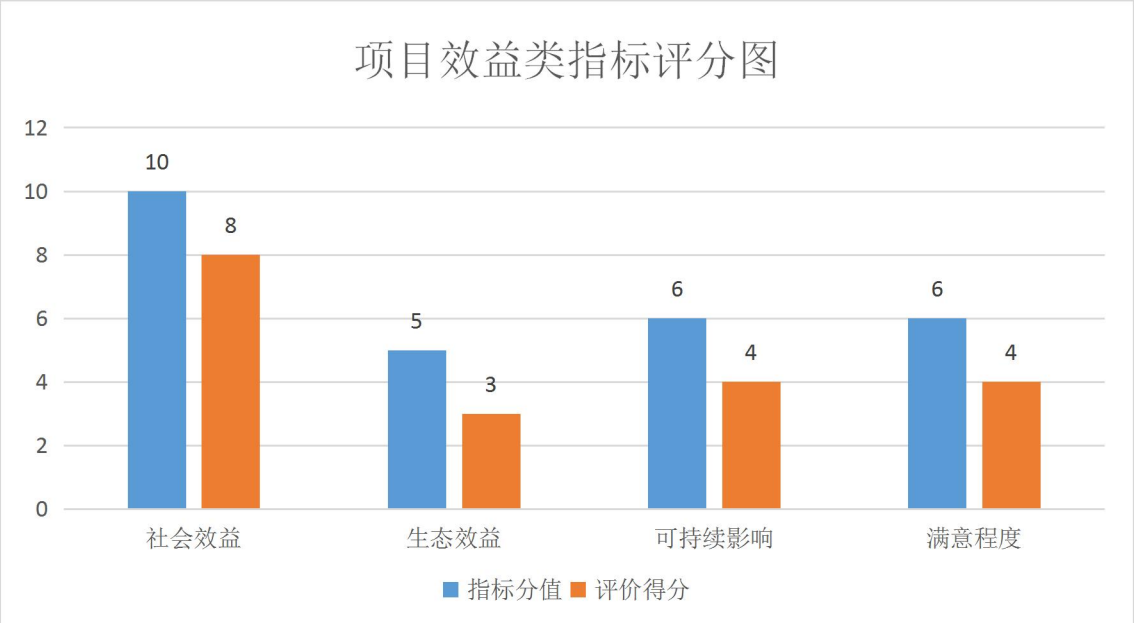

（1） 项目效益

①社会效益

A. 本次农村公路养护项目实施后，农村公路通行条件得

到有效改善，道路通行顺畅度与安全保障能力稳步增强，群众日常出行的便捷性、安全性有所提升，出行成本得到合理控制，出行体验得到一定改善。经现场调查及问卷调查结果显示，该项目针对群众出行的实际改善效果，整体反馈为一般，项目惠民实效的发挥程度有待进一步提升。根据评分标准，此项扣 2.00 分。

此项分值 5.00 分，评价得分为 3.00 分。

B. 该项目通过对路面破损进行常态化修复、系统化完善道路安全防护设施，全方位筑牢乡村道路安全通行防线。一方面，路面经养护实现平整畅通，从源头上消除因道路破损引发交通事故的物理隐患；另一方面，护栏、交通标线等安防设施的规范布设与完善，扎实推进了道路生命防护工程建设，有效地降低了交通事故发生率及道路通行风险，切实为人民群众安全便捷出行筑牢坚实保障。

此项分值 5.00 分，评价得分为 5.00 分。

②生态效益

本项目实施后，通过常态化路面保洁、路肩修整等养护作业，在一定程度上改善了农村公路沿线通行及生态环境面貌，有效解决了路面坑洼、杂物堆积等问题，公路通行环境整洁度、美观度有所提升，人居环境质量得到相应改善；经现场调查及问卷调查结果综合反馈，该项目对农村公路周边环境的实际改

善效果整体一般。根据评分标准，此项扣 2.00 分

此项分值 5.00 分，评价得分为 3.00 分。

③可持续影响

经询问相关人员，目前尚未针对该项目建立专门的后期维护监管制度。现依据山亭区交通运输局的日常工作职责进行管理，由下属交管所指派人员开展不定期巡护，巡护过程中发现问题后，通过微信及时上报需维修的具体位置，但在此过程中未见相关的纸质巡护台账记录。根据评分标准，此项扣 2.00 分。

此项分值 6.00 分，评价得分为 4.00 分。

④满意程度

为了解受益群众对本项目的满意程度，评价小组通过对附近居民发放了问卷进行调查，共发放问卷 46 份，实际收回有效问卷 46 份，经统计，附近居民对本项目的满意度为 80.98%，根据评分标准，此项扣 2.00 分。

此项分值 6.00 分，评价得分为 4.00 分。

四、发现的问题及原因分析

（一）财政资金保障力度不到位。

区财政局作为预算主管单位，资金拨付不及时，未能按合同约定执行付款。根据合同约定，工程完成审计后应支付至审计结算总额的 97%，该项目结算审核报告中显示审定造价金额

为 233.47 万元，而截至评价报告日，区财政仅拨付该项目资金 50.00 万元。

（二）制度执行有效性有待提高

核查发现，项目资金支付未严格遵循合同约定付款，同时，施工日志与监理日志等重要工程资料均未提供。

（三）计划工程量与实际完成情况存在偏差

工程结算审核报告显示，部分项目的计划工程量与实际完成情况存在偏差。具体表现为，计划中的水泥混凝土路面（345m³）、铣刨水稳基层（380m³），以及厚 180mm 与 160mm 的水泥稳定土基层（分别为 1400 ㎡与 800 ㎡）等项目，在实际施工中均未实施。

（四）未按计划完成时间完工。

合同约定的计划工期为：2024 年 7 月 11 日至 2024 年 12 月 31 日，共计 174 日历天。而根据竣工验收记录，项目实际完成共耗时 315 日历天，实际工期较原计划有所延长。

（五）道路养护量化指标缺乏执行追踪

该项目年初设定小修县道≥15 条、养护乡道≥9 条、养护村道≥17 条等年度目标，但年底核查发现，相关责任人未统计实际完成情况，现有资料中亦无明确记录，导致目标完成量无法验证。

（六）后期巡护管理不规范，无台账记录可追溯

该项目未设专门后期维护监管制度，目前由下属交管所指

派人员不定期巡护，发现问题通过微信上报位置，但全程无纸质巡护台账记录，执行情况缺乏书面追溯依据。

（七）部分路段破损未及时处理

经现场群众反馈及评价小组实地核查发现，部分未纳入本次维修养护范围的路段，存在路面裂缝等破损问题，未能得到及时处置。

五、相关建议

（一）建议区财政局严格依据合同约定及审计结果，立即启动剩余款项拨付程序；同步明确财政资金拨付刚性时限，建立财政、审计、项目单位三方联动机制，强化信息共享与协同推进；同时将已审结项目纳入资金保障优先序列，简化审批流程、压缩办理周期，从源头上杜绝类似拖欠问题，切实维护合同严肃性与政府公信力。

（二）严控资金支付。以合同节点、审计结果为依据，将施工日志、监理日志等关键资料作为支付审核必备条件，未齐备则暂停拨付；责成施工、监理单位限期补全缺失资料，逾期约谈负责人或扣款；建立财政、项目单位、监理三方核对机制，确保资料真实完整与支付进度匹配，杜绝违规支付与资料缺漏。

（三）建议强化前期勘察与需求论证。通过现场勘察、历史数据比对精准把握项目需求与实施基础，杜绝盲目套模板的“纸上工程”，从源头提升计划科学性；同时建立动态跟踪机

制，施工全程定期核验进度与计划偏差，对滞后或取消项目及时预警并调整资源配置，减少闲置浪费，确保资金效益与目标匹配。

（四）建议强化全周期进度管控。以原计划为基准细化周/月关键节点目标，同步建立动态调整机制，对滞后环节及时预警并灵活调配资源，确保进度可控；深化前期风险研判，系统梳理本次延期主因（如施工受阻等问题），针对性制定预防措施；完善考核激励机制，将工期履约情况与合同款支付、评优评先直接挂钩，倒逼各方主动压实控期责任，多维度协同发力，切实提升项目管理精细化水平。

（五）建议项目责任主体健全养护工作台账管理制度。对道路养护实施全过程痕迹化管理，及时准确统计各类道路养护完成数量并留存佐证资料，定期开展目标完成情况自查核验，确保年度既定目标可量化、可核查、可追溯，切实保障养护工作成效闭环管理。

（六）建议健全项目后期常态化维护监管制度。规范道路巡护工作流程，明确专人专责落实常态化巡护要求，完善纸质巡护台账登记，详实记录巡护时间、路线、发现问题及处置情况等内容，替代仅通过微信上报的简易方式，形成闭环管理痕迹，确保巡护工作执行情况有据可查、有迹可溯，切实保障后期维护监管工作规范有效落地。

（七）建议对辖区内非本次维修养护范围的道路开展全面排查，对排查发现的路面裂缝等破损问题，建立台账、制定计划、及时处置，切实保障群众出行安全。

六、其他需要说明的问题

本次绩效评价过程中采用部分专家建议和部分调查问卷的方式，因受评价小组成员、相关专家执业水平限制和被调查对象主观感受等因素影响，本次绩效评价项目存在着一定的局限性。

附件：

1. “山亭区2024年农村公路养护工程”项目绩效评价指标体系及得分表

2. 满意度分析报告

3. 项目相关文件、制度

4. 项目现场调查照片

5. 其他

山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）

评价机构负责人：

主评人：

二〇二五年十二月三十一日

附件1：

“山亭区2024年农村公路养护工程”项目绩效评价指标体系及得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	得分率	扣分原因
决策（20分）	项目立项（6分）	立项依据充分性（4分）	项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况	评价要点： ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划、行业发展规划和相关政策要求； ②项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需； ③项目是否属于公共财政支持范围，是否符合支出责任划分原则； ④项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。 评分说明：以上要素各占 1/4 权重分，每发现一项不符合，扣除该项权重分。	4.00	100.00%	
		立项程序规范性（2分）	项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况	评价要点：①项目是否按照规定的程序申请设立； ②审批文件、材料是否符合相关要求。 评分说明：以上要素各占 1/2 权重分，每发现一项不符合，扣除该项权重分。	2.00	100.00%	
	绩效目标（6分）	绩效目标合理性（3分）	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况	评价要点： ①项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性； ②项目预期产出效益和效果是否符合目标要求； ③是否与预算确定的资金量相匹配。 评分说明： 以上要素各占 1/3 权重分，每发现一项不符合，扣除该项权重分。	3.00	100.00%	
		绩效指标明确性（3分）	依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况	评价要点： ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标； ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现； ③是否与项目目标任务数相对应。 评分说明： 以上要素各占 1/3 权重分，每发现一项不符合，扣除该项权重分。	3.00	100.00%	

附件1：

“山亭区2024年农村公路养护工程”项目绩效评价指标体系及得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	得分率	扣分原因
	资金投入（8分）	预算编制科学性（4分）	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况	评价要点： ①预算编制是否经过科学论证； ②预算内容与项目内容是否匹配； ③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制； ④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。 评分说明： 以上要素各占 1/4 权重分，每发现一项不符合的，扣除该项权重分。	4.00	100.00%	
		资金分配合理性（4分）	项目预算资金分配是否有测算依据，与相关或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况	评价要点： ①预算资金分配依据是否充分； ②资金分配额度是否合理，与项目单位或地方实际是否相适应。 评分说明： 以上要素各占 1/2 权重分，每发现一项不符合，扣除该项权重分。	4.00	100.00%	
过程	资金管理（12分）	资金到位率（4分）	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。	评价要点： 资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。 评分方法： 得分=资金到位率×指标分值，最高得分4分。	0.84	20.97%	预算资金为238.38万元元，实际到位资金50万元，资金到位率为20.97%。
		预算执行率（4分）	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。	评价要点： 预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。 实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。 评分方法： 得分=预算到位率×指标分值，最高得分4分。	4.00	100.00%	
		资金使用合规性（4分）	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	评价要点： ①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况； ②是否符合项目预算批复或合同规定的用途；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续； 评分方法： 2项各占1/2权重分，若有一项不满足，则扣除相应权重分。	4.00	100.00%	

附件1：

“山亭区2024年农村公路养护工程”项目绩效评价指标体系及得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	得分率	扣分原因
（25分）	组织实施（13分）	管理制度健全性（4分）	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	评价要点： ①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度； ②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。 评分方法： 2项各占1/2权重分，若有一项不满足，则扣除相应权重分。	4.00	100.00%	
		制度执行有效性（5分）	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。	评价要点： ①是否遵守相关法律法规和相关管理规定； ②项目调整及支出调整手续是否完备； ③项目实施是否按照政府采购的相关制度和合同管理执行； ④项目合同书、项目验收报告等资料是否齐全并及时归档； ⑤档案归档是否落实专人负责汇总统一保管，且保存完善，分类清晰，易于查找。 评分方法： 发现一处扣1分，扣完为止。	3.00	60.00%	1.资金支付未完全遵照合同约定流程执行。 2.未见施工日志、监理日志。
		信息公开及时性（4分）	项目信息公开渠道是否符合规定；公开时间是否及时；公开内容是否真实。	评价要点： 查看相关网站，该项目实施情况、预决算支出是否及时公开。 评分方法： ①在相关官网及时公开该项目的相关信息得2分，否则不得分。②预、决算费用支出及时在相关网站公开得2分，否则不得分。	4.00	100.00%	
产出（28分）	产出数量（7分）	工程量完成情况(7分)	对公路养护工程量完成情况进行评价	评价要点： 该项目是否按照计划工程量完成 评分方法： 按照计划全部完成得7分，每发现一处不一致扣0.2分，扣完为止。	3.20	45.71%	部分工程的实际完成工程量与原计划工程量存在19处不一致的情况，
	产出质量（7分）	完工验收合格率（7分）	对项目验收合格情况进行评价	评价要点： 项目是否验收合格 评分发放： 项目及时验收合格得7分，每发现一处有质量问题的扣0.2分，扣完为止。	7.00	100.00%	
	产出时效（7分）	工程完成的及时性（7分）	项目完成时效是否满足合同要求，是否严格按照项目任务规定时间完成。	评价要点： 项目是否按照合同规定的时间完成 评分方法： 建设进度或完工时间与计划相符，得7分。若发现建设进度滞后时间小于6个月，扣3分；建设进度滞后时间超过6个月的，不得分。	4.00	57.14%	合同约定的计划工期为：2024年7月11日至2024年12月31日，共计174日历天,项目实际完成共耗时315日历天。

附件1：

“山亭区2024年农村公路养护工程”项目绩效评价指标体系及得分表

一级指标及分值	二级指标及分值	三级指标及分值	指标解释	评价标准	得分	得分率	扣分原因
	产出成本（7分）	项目成本控制情况（7分）	对项目成本是否超出计划进行评价	评价要点： 对项目成本是否超出计划进行评价 评分方法： 每超出计划1%扣1分，扣完为止	7.00	100.00%	
效益（27分）	项目效益（27分）	社会效益（10分）	反映项目的实施是否改善群众出行条件（5分）	该项分值5分。改善效果显著得5分，效果一般得3分，效果较差得0分。	3.00	60.00%	经现场调查及问卷调查结果显示，该项目针对群众出行的实际改善效果，整体反馈为一般，项目惠民实效的发挥程度有待进一步提升。
			反映项目的实施是否提升交通安全水平（5分）	该项分值5分。提升效果明显得5分，提升效果一般得3分，未提升不得分。	5.00	100.00%	
		生态效益（5分）	反映项目的实施是否改善农村公路周边环境（5分）	该项分值5分。改善显著得5分，改善一般得3分，未改善不得分。	3.00	60.00%	经现场调查及问卷调查结果综合反馈，该项目对农村公路周边环境的实际改善效果整体一般
		可持续影响（6分）	长效管护机制（6分）	该项分值6分。建立后期维护制度并且执行到位得6分，未建立后期维护制度但维护管理到位得4分，未建立后期维护制度也未维护管理得0分。	4.00	66.67%	未针对该项目建立专门的后期维护监管制度，通过日常职责进行巡护，微信上报，未见相关纸质巡护台账。
		满意程度（6分）	服务对象对项目实施的满意度（6分）	该项分值6分。满意度90%以上得6分，满意度小于90%且大于等于85%得5分，满意度小于85%且大于80%得4分，满意度小于60-80%得3分，低于60%不得分。	4.00	66.67%	满意度80.98%
合计					80.04		

附件 2：满意度分析报告

山亭区 2024 年农村公路养护工程满意度调查问卷

尊敬的受访者：

您好！为客观评价本次农村公路养护工程的实施成效，了解项目服务对象的实际感受，我们特开展此次满意度调查。您的回答对项目绩效评价和后续养护工作优化至关重要，问卷采用匿名形式，信息仅用于统计分析，请您放心如实填写。感谢您的支持与配合！

年　　月

基本信息：　　市　　县（区）　　村

1.您的身份类型：

A.公路沿线村民　　B.当地村干部或乡镇工作人员

C.经常使用该路段的司机/运输从业者 D.项目周边企业或商户代表

E.其他（请注明）：_____

2.您是否看到过针对路面破损（如修补坑槽、裂缝）的专业养护作业？

A.经常看到　　B.偶尔看到

C.很少看到　　D.从未看到

3.您认为现有的养护工作是否能及时处理路面出现的损坏？

A.非常及时　　B.比较及时

C.一般，有时有延迟　　D.不及时，损坏存在很久才处理

E.不清楚

4.您对养护后公路路面平整度的满意程度：

A.非常满意　　B.比较满意

C.一般　　D.不太满意

5.您对养护后公路排水设施（边沟、涵洞等）的满意程度：

A.非常满意　　B.比较满意

C.一般　　D.不太满意

6.您对养护后公路交通安全设施（护栏、警示标志等）的满意程度：

A.非常满意　　B.比较满意

C.一般　　D.不太满意

7.您认为本次养护工程对提升交通安全水平的效果如何？

A.非常显著　　B.较为显著

C.一般　　D.没有提升

8.您认为本次养护工程对改善农村公路周边环境的效果如何？

A.非常显著　　B.较为显著

C.一般　　D.没有改善

9.您对项目后续的维护工作满意度如何？

A.非常满意　　B.比较满意

C.一般　　D.不太满意

10.您认为养护工程对改善沿线出行条件的成效：

A.成效极大　　B.成效较大

C.成效一般　　D.成效较小

11.您认为当前农村公路养护工作中存在的最突出问题是（可多选）：

A,路面破损严重，修复不及时

B.排水设施不完善

C.交通安全设施缺失或损坏

D.养护资金不足

E.养护责任不明确

F.管理不到位（如路面被占用、垃圾堆积）

G.养护人员专业水平不足

H.其他_____

山亭区2024年农村公路养护工程
绩效评价服务对象满意度调查分析报告

一、调研对象与调研内容

（一）调研对象

本次调查采用了问卷调查法，调查对象涵盖枣庄市山亭区2024年农村公路养护工程项目的受益居民。

（二）调研内容

针对山亭区2024年度农村公路养护工程项目实施情况，围绕居民身份类型、养护的及时性、项目的满意程度及当前存在的情况等设计相关问题，形成调查问卷，全面收集受益居民的反馈意见和建议。

二、调研方法与抽样方式

（一）调研方法

根据前期查阅项目相关资料，综合采用多元化调研方式：线上通过微信社交平台发放问卷二维码，方便居民便捷填写；线下走访开展面对面交谈，深入了解居民真实诉求。

（二）抽样方式

根据山亭区2024年农村公路养护工程项目受益居民清单的样本分布，科学采用多段随机抽样方法，按县道、乡道、村道分层抽样，保证最终执行样本的代表性。同时，严格按照统计学要求确定最低样本量，确保评价结果的科学性和可靠性。

三、问卷的发放和回收

本次满意度调查通过线上、线下问卷发放的方式收集信息。为

保障问卷质量，实施严格的质量管控：一是监控问卷填写时间；二是对不同渠道收集的问卷信息进行相互验证，排查矛盾数据，确保问卷信息的真实性和全面性。本次调查共收集调查问卷 46 份，经审核全部为有效问卷，有效回收率 100%。经汇总统计，枣庄市山亭区 2024 年农村公路养护工程项目受益居民整体满意度为 80.98%。

四、满意度分析

1.身份类型调查结果如下：

关于身份类型调查结果，其中：公路沿线村民的为 44 人，占比 95.65%；当地村干部或乡镇工作人员的为 0 人，占比 0%；经常使用该路段的司机/运输从业者的为 0 人，占比 0%；项目周边企业或商户代表的为 1 人，占比 2.17%，其他的为 1 人，占比 2.17%。

选项	小计	比例
A.公路沿线村民	44	95.65%
B.当地村干部或乡镇工作人员	0	0%
C.经常使用该路段的司机/运输从业者	0	0%
D.项目周边企业或商户代表	1	2.17%
E.其他（请注明）:	1	2.17%
本题有效填写人次	46	

2.是否看到过针对路面破损（如修补坑槽、裂缝）的专业养护作业？调查结果如下：

关于是否看到过针对路面破损（如修补坑槽、裂缝）的专业养护作业调查结果，其中：经常看到的为 13 人，占比 28.26%；偶尔看到的为 8 人，占比 17.39%；很少看到的为 21 人，占比 45.65%，从未看到的为 4 人，占比 8.7%。

选项	小计	比例
A.经常看到	13	28.26%
B.偶尔看到	8	17.39%
C.很少看到	21	45.65%
D.从未看到	4	8.7%
本题有效填写人次	46	

3.现有的养护工作是否能及时处理路面出现的损坏？调查结果如下：

关于现有的养护工作是否能及时处理路面出现的损坏调查结果，其中：非常及时的为 8 人，占比 17.39%；比较及时的为 4 人，占比 8.7%；一般，有时有延迟的为 20 人，占比 43.48%；不及时，损坏存在很久才处理的为 13 人，占比 28.26%，不清楚的为 1 人，占比 2.17%

选项	小计	比例
A.非常及时	8	17.39%
B.比较及时	4	8.7%
C.一般，有时有延迟	20	43.48%
D.不及时，损坏存在很久才处理	13	28.26%
E.不清楚	1	2.17%
本题有效填写人次	46	

4.养护后公路路面平整度的满意程度，调查结果如下：

关于养护后公路路面平整度的满意程度的调查结果，其中：非常满意的为 12 人，占比 26.09%；比较满意的为 25 人，占比 54.35%；一般的为 4 人，占比 8.7%；不太满意的为 5 人，占比 10.87%。

选项	小计	比例
A.非常满意	12	26.09%
B.比较满意	25	54.35%
C.一般	4	8.7%
D.不太满意	5	10.87%
本题有效填写人次	46	

5.养护后公路排水设施（边沟、涵洞等）的满意程度，调查结果如下：

关于养护后公路排水设施（边沟、涵洞等）的满意程度的调查结果，其中：非常满意的为 11 人，占比 23.91%；比较满意的为 28 人，占比 60.87%；一般的为 5 人，占比 10.87%；不太满意的为 2 人，占比 4.35%。

选项	小计	比例
A.非常满意	11	23.91%
B.比较满意	28	60.87%
C.一般	5	10.87%
D.不太满意	2	4.35%
本题有效填写人次	46	

6.养护后公路交通安全设施（护栏、警示标志等）的满意程度，调查结果如下：

关于养护后公路交通安全设施（护栏、警示标志等）的满意程度的调查结果，其中：非常满意的为 9 人，占比 19.57%；比较满意的为 32 人，占比 69.57%；一般的为 3 人，占比 6.52%；不太满意的为 2 人，占比 4.35%。

选项	小计	比例
A.非常满意	9	19.57%
B.比较满意	32	69.57%
C.一般	3	6.52%
D.不太满意	2	4.35%
本题有效填写人次	46	

7.本次养护工程对提升交通安全水平的效果如何？调查结果如下：

关于本次养护工程对提升交通安全水平的效果如何的调查结果，其中：非常显著的为 12 人，占比 26.09%；较为显著的为 28 人，占比 60.87%；一般的为 3 人，占比 6.52%；没有提升的为 3 人，占比 6.52%。

选项	小计	比例
A.非常显著	12	26.09%
B.较为显著	28	60.87%
C.一般	3	6.52%
D.没有提升	3	6.52%
本题有效填写人次	46	

8.本次养护工程对改善农村公路周边环境的效果如何？调查结果如下：

关于本次养护工程对改善农村公路周边环境的效果如何的调查结果，其中：非常显著的为 8 人，占比 17.39%；较为显著的为 14 人，占比 30.43%；一般的为 18 人，占比 39.13%；没有改善的为 6 人，占比 13.04%。

选项	小计	比例
A.非常显著	8	17.39%
B.较为显著	14	30.43%
C.一般	18	39.13%
D.没有改善	6	13.04%
本题有效填写人次	46	

9.项目后续的维护工作满意度，调查结果如下：

关于项目后续的维护工作满意度的调查结果，其中：非常满意的为 7 人，占比 15.22%；比较满意的为 25 人，占比 54.35%；一般的为 8 人，占比 17.39%；不太满意的为 6 人，占比 13.04%。

选项	小计	比例
A.非常满意	7	15.22%
B.比较满意	25	54.35%
C.一般	8	17.39%
D.不太满意	6	13.04%
本题有效填写人次	46	

10.养护工程对改善沿线出行条件的成效，调查结果如下：

关于养护工程对改善沿线出行条件的成效的调查结果，其中：成效极大的为 6 人，占比 13.04%；成效较大的为 13 人，占比 28.26%；成效一般的为 21 人，占比 45.65%；成效较小的为 6 人，占比 13.04%。

选项	小计	比例
A.成效极大	6	13.04%
B.成效较大	13	28.26%

C.成效一般	21	45.65%
D.成效较小	6	13.04%
本题有效填写人次	46	

11.当前农村公路养护工作中存在的最突出问题（多选），调查结果如下：

关于当前农村公路养护工作中存在的最突出问题的调查结果，其中：路面破损严重，修复不及时的为31人，占比67.39%；排水设施不完善的为3人，占比6.52%；交通安全设施缺失或损坏的为12人，占比26.09%；养护资金不足的为1人，占比2.17%，养护责任不明确的为5人，占比10.87%，管理不到位（如路面被占用、垃圾堆积）的为19人，占比41.3%，养护人员专业水平不足的为2人，占比4.35%，其他的为4人，占比8.7%。

选项	小计	比例
A,路面破损严重，修复不及时	31	67.39%
B.排水设施不完善	3	6.52%
C.交通安全设施缺失或损坏	12	26.09%
D.养护资金不足	1	2.17%
E.养护责任不明确	5	10.87%
F.管理不到位（如路面被占用、垃圾堆积）	19	41.3%
G.养护人员专业水平不足	2	4.35%
H.其他	4	8.7%
本题有效填写人次	46	

附件 3：相关文件、制度

中华人民共和国中央人民政府
www.gov.cn

国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见

国办发〔2019〕45号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构：

农村公路是服务“三农”的公益性基础设施，是打赢脱贫攻坚战、实施乡村振兴战略的重要抓手。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视农村公路工作，多次对“四好农村路”建设作出重要部署。为切实解决“四好农村路”工作中管好、护好的短板问题，加快建立农村公路管理养护长效机制，经国务院同意，现就深化农村公路管理养护体制改革提出以下意见：

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神，认真落实习近平总书记关于“四好农村路”的重要指示精神和党中央、国务院决策部署，践行以人民为中心的发展思想，紧紧围绕打赢脱贫攻坚战、实施乡村振兴战略和统筹城乡发展，以质量为本、安全至上、自然和谐、绿色发展为原则，深化农村公路管理养护体制改革，加强农村公路与农村经济社会发展统筹协调，形成上下联动、密切配合、齐抓共管的工作局面，推动“四好农村路”高质量发展，为广大农民群众致富奔小康、加快推进农业农村现代化提供更好保障。

二、工作目标

各地区、各部门要将深化农村公路管理养护体制改革作为打赢脱贫攻坚战、实施乡村振兴战略、推进农业农村现代化的一项先行工程，同步部署落实。各省级人民政府要加强统筹和指导，制定本辖区改革实施方案，协调解决重大问题，督促地方各级人民政府压实责任，认真抓好任务落实。各有关部门要密切配合，按照职责完成各项任务。交通运输部要加强工作指导和督促检查，重大情况及时报告国务院。

本意见自印发之日起施行。《国务院办公厅关于印发农村公路管理养护体制改革方案的通知》（国办发〔2005〕49号）同时废止。

国务院办公厅

2019年9月5日

（此件公开发布）

索 引 号：000014349/2019-00101　　主题分类：工业、交通\公路
发文机关：国务院办公厅　　成文日期：2019年09月05日
标　　题：国务院办公厅关于深化农村公路管理养护体制改革的意见
发文字号：国办发〔2019〕45号　　发布日期：2019年09月23日

中华人民共和国中央人民政府
www.gov.cn

中华人民共和国交通部令

2006 年 第 3 号

《农村公路建设管理办法》已于2006年1月26日经第2次部务会议通过，现予公布，自2006年3月1日起施行。

部 长 李盛霖

二〇〇六年一月二十七日

农村公路建设管理办法

第一章 总 则

第一条 为加强农村公路建设管理，促进农村公路健康、持续发展，适应建设社会主义新农村需要，根据《中华人民共和国公路法》，制定本办法。

第二条 本办法适用于各级人民政府和有关部门投资的农村公路新建和改建工程的建设管理。

本办法所称农村公路，包括县道、乡道和村道。

第三条 农村公路建设应当遵循统筹规划、分级负责、因地制宜、经济实用、注重环保、确保质量的原则。

第四条 农村公路建设应当由地方人民政府负责。其中，乡道由所在乡（镇）人民政府负责建设；在当地人民政府的指导下，村道由村民委员会按照村民自愿、民主决策、一事一议的方式组织建设。

第五条 农村公路建设项目应当依据农村公路建设规划和分阶段建设重点，按照简便适用、切合实际的原则和国家规定的程序组织建设。

第六条 农村公路建设应当保证质量，降低建设成本，节能降耗，节约用地，保护生态环境。

国家鼓励农村公路建设应用新技术、新材料、新工艺。

第七条 交通部负责全国农村公路建设的行业管理。

省级人民政府交通主管部门依据职责负责本行政区域内农村公路建设的管理。

设区的市和县级人民政府交通主管部门依据职责负责本行政区域内农村公路建设的组织和管理。

第二章 标准与设计

第四十五条 违反本办法规定，农村公路建设资金不按时到位或者截留、挤占和挪用建设资金的，由上一级人民政府交通主管部门或者本级人民政府对责任单位进行通报批评，限期整改；情节严重的，停止资金拨付，对责任人依法给予行政处分。

第四十六条 违反本办法规定，擅自降低征地补偿标准，拖欠工程款、征地拆迁款和农民工工资的，由上一级人民政府交通主管部门或者本级人民政府对责任单位进行通报批评，限期整改；情节严重的，对责任人依法给予行政处分。

第四十七条 违反本办法规定，未经验收或者质量鉴定不合格即开放交通的，由上一级人民政府交通主管部门责令停止使用，限期改正。

第四十八条 农村公路建设项目发生质量和安全事故隐瞒不报、谎报或拖延报告期限的，由上一级人民政府交通主管部门对责任单位给予警告，对责任人依法给予行政处分。

第四十九条 农村公路建设项目未依法招标的，依据《中华人民共和国招标投标法》、《公路工程施工招标投标管理办法》等有关规定，对相关责任单位和责任人给予处罚。

第五十条 农村公路建设发生质量违法行为的，依据《建设工程质量管理条例》、《公路建设市场管理办法》、《公路工程质量监督规定》等有关规定对相关责任单位和责任人给予处罚。

第七章 附 则

第五十一条 本办法自2006年3月1日起施行。

2025年12月18日 星期四 繁体版 (https://big5.mot.gov.cn/gate/big5/www.mot.gov.cn/) 网站无障碍
工作邮箱 (https://mail.mot.gov.cn/)

中华人民共和国交通运输部
Ministry of Transport of the People's Republic of China
(https://www.mot.gov.cn/)

首页 (../../../../) > 政策解读 (../../../) > 图解 "四好农村路" (../../) > 相关政策 (../)

农村公路养护管理办法（中华人民共和国交通运输部令2015年第22号）

来源：公路局 2015-12-09 11:04:00 【字号 大 中 小】【我要打印】

《农村公路养护管理办法》已于2015年11月3日经第20次部务会议通过，现予公布，自2016年1月1日起施行。

部长 杨传堂

2015年11月11日

第一章 总 则

第一条 为规范农村公路养护管理，促进农村公路可持续健康发展，根据《公路法》《公路安全保护条例》和国务院相关规定，制定本办法。

第二条 农村公路的养护管理，适用本办法。

本办法所称农村公路是指纳入农村公路规划，并按照公路工程技术标准修建的县道、乡道、村道及其所属设施，包括经省级交通运输主管部门认定并纳入统计年报里程的农村公路。公路包括公路桥梁、隧道和渡口。

县道是指除国道、省道以外的县际间公路以及连接县级人民政府所在地与乡级人民政府所在地和主要商品生产、集散地的公路。

乡道是指除县道及县道以上等级公路以外的乡际间公路以及连接乡级人民政府所在地与建制村的公路。

村道是指除乡道及乡道以上等级公路以外的连接建制村与建制村、建制村与自然村、建制村与外部的公路，但不包括村内街巷和农田间的机耕道。

县道、乡道和村道由县级以上人民政府按照农村公路规划的审批权限在规划中予以确定，其命名和编号由省级交通运输主管部门根据国家有关规定确定。

第三条 农村公路养护管理应当遵循以县为主、分级负责、群众参与、保障畅通的原则，按照相关技术规范和操作规程进行，保持路基、边坡稳定，路面、构造物完好，保证农村公路处于良好的技术状态。

2025年12月18日 星期四 繁体版 (https://big5.mot.gov.cn/gate/big5/www.mot.gov.cn/) 网站无障碍
工作邮箱 (https://mail.mot.gov.cn/)
中华人民共和国交通运输部
Ministry of Transport of the People's Republic of China
(https://www.mot.gov.cn/)

第二十六条 大型建设项目在施工期间需要使用农村公路的，应当按照指定线路行驶，符合荷载标准。对公路造成损坏的应当进行修复或者依法赔偿。

第二十七条 县、乡级人民政府应当依据有关规定对农村公路养护需要的挖砂、采石、取土以及取水给[illegible]协助。

第二十八条 县级人民政府应当按照《公路法》《公路安全保护条例》的有关规定组织划定农村公路用地和建筑控制区。

第二十九条 县级交通运输主管部门和公路管理机构应在当地人民政府统一领导下，大力整治农村公路路域环境，加强绿化美化，逐步实现田路分家、路宅分家，努力做到路面整洁无杂物，排水畅通无淤积，打造畅安舒美的农村公路通行环境。

第四章 法律责任

第三十条 违反本办法规定，在筹集或者使用农村公路养护资金过程中，强制向单位和个人集资或者截留、挤占、挪用资金等违规行为的，由有关交通运输主管部门或者由其向地方人民政府建议对责任单位进行通报批评，限期整改；情节严重的，对责任人依法给予行政处分。

第三十一条 违反本办法规定，不按规定对农村公路进行养护的，由有关交通运输主管部门或者由其向地方人民政府建议对责任单位进行通报批评，限期整改；情节严重的，停止补助资金拨付，依法对责任人给予行政处分。

第三十二条 违反本办法其他规定，由县级交通运输主管部门或者公路管理机构按照《公路法》《公路安全保护条例》相关规定进行处罚。

第五章 附 则

第三十三条 本办法自2016年1月1日起施行。交通运输部于2008年4月发布的《农村公路管理养护暂行办法》（交公路发〔2008〕43号）同时废止。

网站地图 (/wangzhanguanli/index_5247.html) | 网站建设 (/wangzhanjianshe/) | 免责声明 (https://bszs.conac.cn/sitename?method=show&id=0ADE6D983AD137705E053012819AC0D7) | 联系我们 (https://www.mot.gov.cn/wangzhanguanli/201510/t20151018_1912374.html) | 相关链接 (https://www.mot.gov.cn/wangzhanguanli/201511/t20151126_1938922.html) 京公网安备
主办单位:交通运输部政策研究室
开发单位:交通运输部科学研究院
京ICP备05046837号-1 (https://beian.miit.gov.cn)
11040102700014号 (https://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=11040102700014)
政府网站标识码：BM19000004
政府网站找错

枣庄市山亭区交通运输局

山交便字〔2024〕12号

关于山亭区2024年农村公路养护工程投资评审的请示

区政府:

按照区政府安排，我局组织编制了山亭区2024年农村公路养护工程设计文件及工程预算.

山亭区2024年农村公路养护工程，主要为对现有农村公路（县道为主）养护修复包括水混路面的挖补修复、边坡挡墙加固修复、日常养护等工程，该工程费用为307.07万元.该工程监理费拟按工程施工招标合同价的1.0%作为控制价.

请区政府研究并安排有关部门审查设定招标上限价.该项目资金来源为区级财政补助58万和通过体制结算补助到我区养路费转移支付资金188万元，共计246万元.剩余资金将统筹其他交通建设资金.

当否，请批示.

附件：山亭区2024年农村公路养护工程工程量清单汇总表

山亭区交通运输局

2024年4月9日

扫描全能王

枣庄市山亭区财政局

山财投〔2024〕27号

关于山亭区财政投资项目评审及招标说明

经区政府批准，区财政局对枣庄市山亭区交通运输局申请的山亭区2024年农村公路养护工程项目进行了评审并出具评审报告。为了保证该项目的顺利实施，现将有关情况说明如下:

1、山亭区2024年农村公路养护工程项目通过政府采购的方式，控制价为238.38万元。

2.政府投资项目工程施工合同约定合同价款以财政审核作为结算依据，对不符合以上要求的，区财政局将不予审核和拨付相关工程资金。

山亭区财政局

2024年4月19日

山交发〔2019〕4号　　签发人：程卫国

关于拟订山亭区交通运输局“三定”规定的报告

区委深化地方机构改革协调小组办公室：

根据中共枣庄市委、枣庄市人民政府同意印发的《山亭区机构改革方案》（室字〔2019〕4号）、《中共山亭区委 山亭区人民政府关于山亭区区级机构改革的实施意见》（山委〔2019〕1号）和区委常委会确定的本部门机构编制职数框架，我们研究拟订了《山亭区交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定（草案）》，涉及有关职责分工已征求相关部门意见，现送上，请予审核。

附件：山亭区交通运输局职能配置、内设机构和人员编制规定（草案）

中共山亭区交通运输局党组

2019年3月29日

考核、双招双引工作。负责综合治理、应急管理工作。承担抗震救灾、防汛等应对重大自然灾害的交通保障。

（四）运输管理办公室。组织协调公路、水路、铁路、航空、城市客运综合运输。参与拟订现代物流业发展规划、政策，承担现代物流业发展的有关工作。指导城市轨道交通和城市综合枢纽的运营。承担组织协调国家重点物资、紧急客货运输有关工作。协调全区春运工作，承担节日运输有关工作。指导道路旅客运输、货物运输管理。负责道路运输市场监管工作。指导道路运输企业和道路班线客车、旅游包车、危险化学品运输车等营运车辆的安全生产监督管理。负责地方铁路运输市场监管工作。指导与道路运输相关的维修驾培、综合性能检测、搬运装卸、人员培训和运输服务活动的管理。指导城市客运工作。指导网约车等新业态的管理工作。负责船舶检验和监督管理，负责船舶(不含渔业船舶)以及相关水上设施登记、防治污染工作。

机关基层党组织。负责党的建设和群团工作。

第五条 区交通运输局机关行政编制8名(含专职党务工作人员)。设局长1名，副局长2名。

第六条 区交通运输局所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第七条 本规定具体解释工作由中共山亭区委办公室、山亭区人民政府办公室会同中共山亭区委机构编制委员会办公室承担，其调整由中共山亭区委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第八条 本规定自2019年3月 日起施行。

财务管理制度

第一章总则

第一条为规范和加强单位财务管理，提高资金使用效益，保障单位经济活动健康发展，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《政府会计准则一基本准则》等法规，结合本单位实际，制定本制度。

第二条单位财务管理的原则

有效执行国家有关法律、法规和财务规章制度；科学管理、精细核算，坚持厉行节约，制止奢侈浪费；量入为出，保障重点，兼顾一般；降低行政成本，注重资金使用效益。

第三条单位财务管理的内容包括：财务机构和组织、预算管理、收入管理，支出管理、资产管理、财务分析与报告、会计电算化、会计档案和财务审计管理等。

第四条单位财务管理的基本任务

（一）科学合理、完整准确编制预算，并对预算执行进行控制，统筹安排，节约使用资金，保障单位正常运转的资金需要；

（二）编制财务报表，如实反映单位收支情况；

（三）建立、健全内部财务管理制度，规范会计核算，实施绩效管理，充分发挥财务工作在经济管理中的有效作用；

第五十三条本制度所涉及的内容，凡党和国家的政策法规、上级单位另有规定的，从其规定。

第五十四条本制度由财务审计股拟定，报党组会批准后施行，解释权归财务审计股。

第五十五条本制度自印发之日起施行。

档案管理规定

为进一步加强我局档案管理工作，使机关档案标准化，根据《中华人民共和国档案法》、《机关档案业务建设规范》等有关规定，结合实际，制定本规定。

一、局机关档案除会计档案外实行联合全宗，由文书档案、照片档案、音像档案、实物档案等构成。

二、根据工作需要，局会计档案，作为一个独立全宗，由档案管理人员进行分类整理，统一管理。

三、局机关形成的全部档案除由局档案室负责集中统一管理，以确保档案完整与安全。局档案室隶属办公室管理，办公室设专兼职档案员具体负责。

四、机关档案工作人员基本任务：

1、收集、整理、保管本机关在各项工作中形成的各种门类、载体具有保存价值的档案，并负责提供利用；

2、按照有关规定，对本机关的档案进行定期鉴定，并负责向区档案馆移交；

3、办理领导交办的其它档案业务工作。

五、凡机关工作活动中形成的具有保存价值的各种门类载体文书材料，都应按照要求进行立卷归档。立卷归档分工：

1、文书档案在文书材料办理结束后，由办公室立卷归档；

九、局档案室要建立严格的档案借阅审批手续和借阅登记制度。

十、机关档案室对所保管的档案要实行科学管理，配置相应数量的档案专具，设专用库房并配备空调机、去湿机、吸尘器、温湿度表等设施，保证库房温湿度控制在符合档案保护的要求。做好“九防”等安全工作。档案排列做到整齐美观有序，便于查找利用，坚持库房卫生制度，保持库房卫生整洁。

十一、建立档案统计制度。对档案的收进、移出、保管、利用、销毁等情况，应及时、准确统计、明确记载，并按规定向同级地方档案管理机关报送档案工作基本情况统计表。

十二、局档案室根据国家档案局的有关规定，制定本机关和本系统的《档案保管期限表》和《文件材料归档与不归档的范围》，对超过保管期限的档案，由局档案室和有关业务部门联合进行鉴定，对确无保存价值的档案应登记造册，经办公室分管领导人批准后销毁。

十三、机关档案应按规定向同级档案馆移交，永久档案在本机关保存二十年后，连同案卷目录一式三份和有关的检索工具、参考资料。

建设项目管理制度

第一章总则

第一条为进一步加强单位基本建设项目管理，确保项目工程规范实施，根据《中华人民共和国建筑法》（中华人民共和国主席令【1997】第91号）、《中华人民共和国政府采购法》（中华人民共和国主席令【2014】第14号）、《中华人民共和国招标投标法》（中华人民共和国主席令【1999】第21号）等法律法规要求，结合单位实际，制定本管理制度。

第二条本制度所称建设项目是指单位实施的建筑工作、基础设施工程、设备安装工程，以及与工程项目相关的工程勘察、设计、监理、审计等内容，包括新建、改建、扩建、加固、维修改造、装饰、绿化基础设施等。

第三条建设项目应遵循退票费挖掘、经济适用、节能降耗、突出重点统筹兼顾和效益优先的原则。

第四条项目建设程序包括：建设申请、实施方案编制、项目预算编制和评审、工程招投标、组织施工、竣工验收、资料归档等。

第五条建设项目决策应严格执行“三重一大”集体决策制度，遵守基本建设程序，坚持先规划论证、再设计审批、后施工备案。

第六条建设项目管理实行项目法人责任制、招标投标制，

工程监理制、合同审核会签制、竣工验收备案制、工程预决算审核制、工程质量保修制等制度。

第七条为加强基建项目的管理，单位成立建设项目管理部门，由分管领导任建办主任，建设管理科牵头组织。

第八条本管理制度适用于山亭区交通运输局。

第二章项目立项

第九条基本建设项目必须通过立项程序方可确定。

各单位（科室）根据上级工作安排和单位年度工作计划，提出项目建议，经党组会议研究通过，向区财政部门申请立项。

立项申请一般应于每年年初提出。

第十条需要到区发改部门立项的项目，依照有关程序和要求办理。


第十一条不需要到区发改部门立项的项目，由经办部门填制《立项申请表》后，依照如下程序和要求申请立项。


（一）工程预算5万元（含5万元）以下的小型建设或维修项目（以下称一般项目），由党组会议集体研究批准建设，并报区财政部门备案。

（二）工作预算 5-30万元（含30万元）的项目（以下称规模项目），由经办科室向区财政部门提出申请报告，报告内容主要包括：项目建设的理由、建设内容，建设规模、资金来源等，区财政部门对项目的可行性、科学性和合理性

4、项目现场调查照片



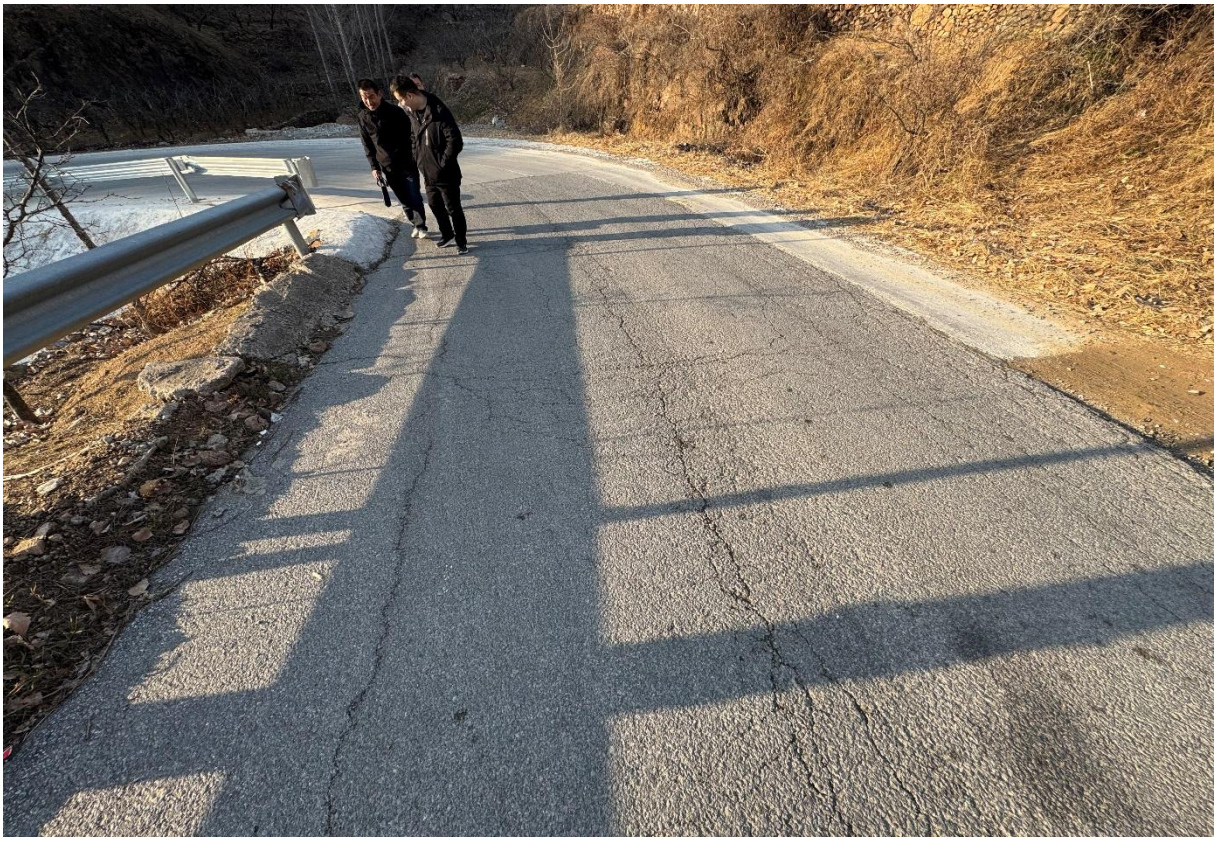

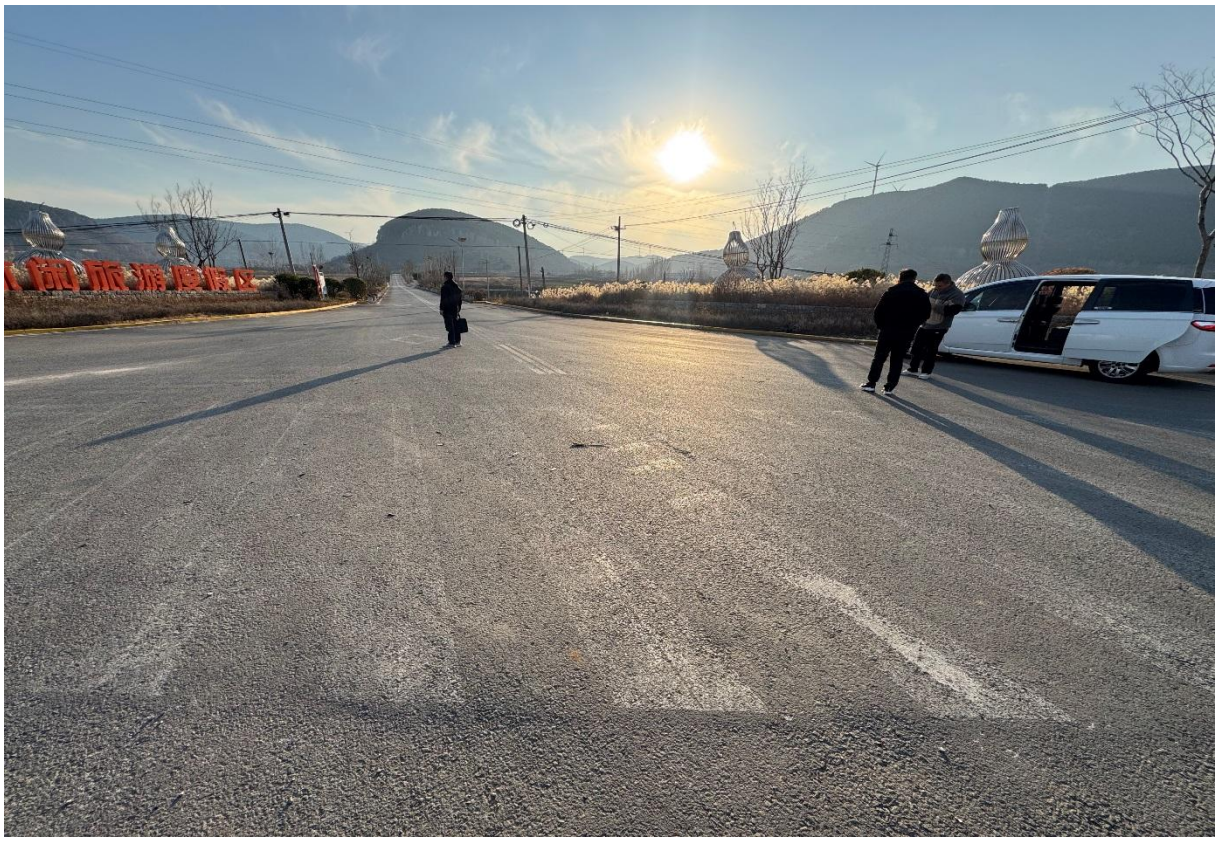




23







5、其他

山亭区2024年农村路养护工程项目
项目结算审核报告

鲁山威造审字【2025】第206号

枣庄市山亭区交通运输局：

根据贵单位的委托要求，我公司遵循“客观、公正、高效、准确”的服务宗旨，坚持“实事求是，客观公正，诚实信用”的原则，组织工程造价人员对枣庄市顺达公路工程有限公司施工的山亭区2024年农村路养护工程项目的结算进行审核，现将审核情况报告如下：

一、工程概况

本项目为山亭区2024年农村路养护工程项目。主要内容包括：路基挖填、路面铺筑、安全设施及预埋管线、路面清扫等。

二、审核范围

本审计报告对山亭区2024年农村路养护工程项目的结算进行项目审核。

三、审核依据

委托单位提供的以下资料：招投标文件、施工合同、工程联系单、工程签证单、验收证明、施工单位报送的工程预算书等资料；各方共同认可的材料价格。

四、审核原则

1、遵守现行的法律、法规、规章、规范性文件及行业规定要求，按相应的标准、规范技术文件执业。

2、实事求是，客观公正，公平公开。

五、审核方法

依据送达资料，采取全面审查法，对审核范围内的事项进行全面审查，对每一个数据进行逐项落实。

六、审核过程

对该工程实施审核的主要程序是：

1、接收建设单位提供的资料和文件，出具接收资料明细单。

2、进行审前调查，制定实施方案，配备操作人员。

扫描全能王

3、现场勘查、测量，了解情况。

4、开展工程造价的各项计量、确定和其他工作，对工程对象和原报结算资料和合同、签证等资料进行仔细的计算、分析、归纳、总结。

5、与建设单位、施工单位进行沟通，对报送的结算内容进行核对，对依据充分各方认可的内容进行归纳、打印。

6、编制结算审核报告初稿，实施内部复核并征询各方意见。

7、各方确认审核结果后，各方造价专业人员在相关专业造价汇总表上签字盖章，建设各方在《工程造价审核定案表》上签字盖章。

8、由本单位法定代表人签署出具正式审核报告。

9、咨询成果交付与资料交接。

七、审核结果

该工程结算送审总金额 2545818.95 元，审定总金额 2334746.48 元，核减金额 211072.47 元。

八、声明

1、委托单位提供资料的真实性、完整性由资料提供方负责，因资料失实造成审核结果出现偏差或失误，我公司及相关人员不承担相应责任。

附件：

1、工程造价审核定案表

2、工程结算审核明细表

3、双方所签的施工合同、签证单等与工程结算有关的依据性资料

编制人：



审核人：



单位公章：



2025年07月30日

扫描全能王

工程造价审核定案表

工程名称	山亭区2024年农村路养护工程项目	工程地址	山亭区
咨 询 结 果			
送审工程造价（元）		2545818.95	
审定工程造价（元）		2334746.48	
净审减值（元）		211072.47	
其中：审增值（元）			
净审减率（%）			
建设单位	施工单位	咨询单位	
经办人：范蜡 2025年7月31日	经办人：张明俊 2025年7月31日	年 月 日	

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

项目支出绩效目标表

项目名称			山亭区农村公路养护费		
主管部门			枣庄市山亭区交通运输局	实施单位	枣庄市山亭区交通运输局
项目资金（万元）			年度预算资金总额：	246	
			其中：财政拨款	246	
			其他资金		
年度总体绩效目标	通过完善41条农村公路的养护，确保山亭区内公路整洁、安全、畅通。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	厚5㎝沥青混凝土单位成本控制数	≤75元/㎡	
			山亭区农村公路养护支出控制数	≤246万元	
	产出指标	数量指标	小修县道个数	≥15条	
			养护乡道个数	≥9条	
			养护村道个数	≥17条	
		质量指标	项目验收合格率	100%	
		时效指标	路面养护及时率	100%	
	效益指标	社会效益指标	基本公共服务水平	有效提升	
			提升居民生活环境．	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目区群众满意度	≥90%	

金算盘软件 移动点越管理 www.eabax.com

记 账 凭 证

凭证字 记[预算]
凭证号：0007

2025 年 10 月 31 日

摘要	会计科目 一级科目	会计科目 明细科目	借方	贷方
付2024年农村公路养护工程款	2101-01-02-310 业务活动费用-财政拨款支出-政府基金预算拨款\02-39 山亭区农村公路养护工程\310-05 基础设施建设\212-08-04 农村基础设施建设支出		500,000.00	
付2024年农村公路养护工程款	6001-02 财政拨款预算收入-政府性基金预算拨款\02-39 山亭区农村公路养护工程\212-08-04 农村基础设施建设支出			500,000.00
合计	伍拾万元整		¥500,000.00	¥500,000.00

附件 7 张

会计主管：谢艳　　记账：谢艳　　复核：谢艳　　制单：潘艳萍　　出纳：

金算盘软件 移动点越管理 www.eabax.com

记 账 凭 证

凭证字 记[财务]
凭证号：0007

2025 年 10 月 31 日

摘要	会计科目 一级科目	会计科目 明细科目	借方	贷方
付2024年农村公路养护工程款	6001-01-02-310 业务活动费用-财政拨款支出-政府基金预算拨款-资本性支出\02-39 山亭区农村公路养护工程\310-05 基础设施建设\212-08-04 农村基础设施建设支出		500,000.00	
付2024年农村公路养护工程款	4001-02 财政拨款收入-政府性基金预算拨款\02-39 山亭区农村公路养护工程\212-08-04 农村基础设施建设支出			500,000.00
合计	伍拾万元整		¥500,000.00	¥500,000.00

附件 7 张

会计主管：谢艳　　记账：谢艳　　复核：谢艳　　制单：潘艳萍　　出纳：

建筑服务

电子发票（普通发票）

发票号码：25372000002908722221

开票日期：2025年10月22日

10.22

购买方信息	名称：枣庄市山亭区交通运输局 统一社会信用代码/纳税人识别号：11370406004246147O	销售方信息	名称：枣庄市顺达公路工程有限公司 统一社会信用代码/纳税人识别号：91370400735769697G

项目名称	建筑服务发生地	建筑项目名称	金额	税率/征收率	税额
*建筑服务*工程款	山东省枣庄市山亭区	山亭区2024年农村公路养护工程	91743.12	9%	8256.88
合计			¥91743.12		¥8256.88
价税合计（大写）	⊗壹拾万圆整		（小写）¥100000.00		
备注	土地增值税项目编号：-；　跨地（市）标志：否；				

枣庄市顺达公路工程有限公司 91370400735769697G 发票专用章

开票人：马颖

国库集中支付凭证

预算类型：当年预算　　日期：2025年10月23日　　编　　号：04065214-507001-001841

业务类型：　普通业务　　资金性质：预算管理资金

结算方式：电子转账支付　　支票号：　　金额单位：元

付款人	全　称	枣庄市山亭区交通运输局	收款人	全　称	枣庄市顺达公路工程有限公司
	账　号	37001646508058000004		账　号	810700101421014004
	开户行	中国建设银行股份有限公司枣庄山亭支行		开户行	日照银行枣庄支行
一级预算单位		枣庄市山亭区交通运输局	功能科目		2120804 农村基础设施建设支出
基层预算单位		枣庄市山亭区交通运输局机关	备　注		付2024年农村公路养护工程款
金额	人民币（大写）：	壹拾万元整	人民币（小写）：		¥100,000.00

公章：枣庄市山亭区交通运输局 电子支付专用章　2025-10-23 13:45:12

审核人：贾亭传印　2025-10-23 13:44:35

代理银行（公章）：中国建设银行股份有限公司枣庄山亭支行 区级电子支付专用章　2025-10-23 14:26:57

第 1 次打印

山亭区财政电子凭证

建筑服务

电子发票（普通发票）

发票号码：25372000000281766076

开票日期：2025年10月14日

购买方信息	名称：枣庄市山亭区交通运输局	销售方信息	名称：枣庄市顺达公路工程有限公司
	统一社会信用代码/纳税人识别号：11370406004246147O		统一社会信用代码/纳税人识别号：91370400735769697G

项目名称	建筑服务发生地	建筑项目名称	金额	税率/征收率	税额
工程款	山东省枣庄市山亭区	山亭区2024年农村公路养护工程	366972.48	9%	33027.52
合计			¥366972.48		¥33027.52
价税合计（大写）	⊗肆拾万圆整		（小写）¥400000.00		

增值税项目编号：；跨地（市）标志：否；

枣庄市顺达公路工程有限公司 91370400735769697G 发票专用章

开票人：马颖

国库集中支付凭证

预算类型：当年预算　　日期：2025年09月29日　　编　号：04065214-507001-001783

业务类型：普通业务　　资金性质：预算管理资金

结算方式：电子转账支付　　支票号：　　金额单位：元

付款人	全称	枣庄市山亭区交通运输局	收款人	全称	枣庄市顺达公路工程有限公司
	账号	37001646508058000004		账号	810700101421014004
	开户行	中国建设银行股份有限公司枣庄山亭支行		开户行	日照银行枣庄支行
一级预算单位		枣庄市山亭区交通运输局	功能科目		2120804 农村基础设施建设支出
基层预算单位		枣庄市山亭区交通运输局机关	备注		付山亭区2024年农村路养护工程款
金额	人民币（大写）：	肆拾万元整	人民币（小写）：		¥400,000.00

公章：枣庄市山亭区交通运输局 电子支付专用章　　审核人：亭贾印传

2025-09-29 16:18:42　　2025-09-29 16:18:04

代理银行（公章）：中国银行股份有限公司枣庄山亭支行 区级电子支付专用章

2025-09-30 08:48:29

第 2 次打印

凭证

合同编号：【2024】第064号

建设工程造价咨询合同

住房和城乡建设部

国家工商行政管理总局 制定

第一部分 协议书

委托人（全称）：枣庄市山亭区财政局

咨询人（全称）：山东山威项目管理有限公司

根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就下述建设工程委托造价咨询与其他服务事项协商一致，订立本合同。

一、工程概况

1.工程名称：山亭区2024年农村公路养护工程

2.工程地点：山亭区

3.投资金额：3070748.16元

4.资金来源：/

二、服务范围及工作内容

双方约定的服务范围及工作内容：山亭区2024年农村公路养护工程预算评审；全过程跟踪审计服务。

三、服务期限

本合同约定的建设工程造价咨询服务自双方签字盖章后开始实施，至出具结算报告止。

四、质量标准

工程造价咨询成果文件应符合：

国家及省市有关工程计价规定、合同约定、委托方要求及其它。

五、咨询费用

委托人承担的咨询费：

计取方式：审定金额*1.5‰

六、合同文件的构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1.中标通知书或委托书（如果有）；

2.投标函及投标函附录或造价咨询服务建议书（如果有）；

3.专用条件及附录；

4.通用条件；

扫描全能王

5.其他合同文件。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件（包括补充协议）均构成合同文件的组成部分。

七、词语定义

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

八、合同订立

1.订立时间：2024 年 04 月 15 日。

2.订立地点：枣庄市山亭区财政局。

九、合同生效

本合同自签订之日起生效。

十、合同份数

本合同一式伍份，具有同等法律效力，其中委托人执叁份，咨询人执贰份

委托人：（盖章）	咨询人：（盖章）
法定代表人或其授权的代理人：（签字）	法定代表人或其授权的代理人：（签字）
组织机构代码：	组织机构代码：
纳税人识别码：	纳税人识别码：
住　所：	住　所：
账　号：	账　号：
开户银行：	开户银行：
邮政编码：	邮政编码：
电　话：	电　话：

扫描全能王

山东省政府采购合同

（工程类）

项目名称：山亭区2024年农村公路养护工程项目

合同编号：SDGP370406000202402000057A 001

计划编号：370406000541001202400001

采 购 人：枣庄市山亭区交通运输局机关

供 应 商：枣庄市顺达公路工程有限公司

采购代理机构：山东泰康项目管理有限公司

签订时间：二〇二四年七月一十日

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

一、合同协议书

采购人（全称）：枣庄市山亭区交通运输局

供应商（全称）：枣庄市顺达公路工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就 山亭区2024年农村路养护工程项目 工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

1. 工程名称： 山亭区2024年农村路养护工程项目。

2. 工程地点： 枣庄市山亭区。

3. 工程批准文号： / 。

4. 资金来源： 财政资金 。

5. 工程内容：本项目主要为修复性养护中的中修、预防性养护工程，道路等级：二级、三级、四级公路标准，全长：约149公里，主要建设内容为路基、路面维修、日常保洁等工程量清单范围内的所有施工内容。

二、合同工期

计划开工日期：2024 年 7 月 11 日。

计划竣工日期：2024 年 12 月 31 日。

工期总日历天数：174天 。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合 符合现行国家及省、市、行业的有关法规、规范 标准。

四、签约合同价与合同价格形式

签约合同价为：人民币（大写）贰佰叁拾柒万陆仟贰佰玖拾陆元壹角（¥2376296.10元）。

（后附工程量清单）

五、项目经理

供应商项目经理： 马超 ，项目总工： 柏志强 。

六、资金来源

扫描全能王

预算内资金 2376296.10 元；财政专户资金：2376296.10元；自筹资金 / 元。

七、付款方式

□一次性支付方式：_____

☑分期支付方式：本工程无预付款，工程完工经审计后付至工程结算审计总额的97%，剩余3%作为质保金，质保期满后一次性无息付清。

□其他支付方式：_____

八、合同融资事项

按照《山东省财政厅关于启动山东省政府采购合同融资与履约保函服务平台有关事项的通知》【鲁财采（2020）31号】、《山东省财政厅关于加强政府采购合同付款账户管理的通知》【鲁财采（2021）4号】文件相关要求，本合同可用于“山东省政府采购合同融资与履约保函服务平台”（简称融资平台）进行质押融资，如本合同已通过融资平台质押融资，融资平台将生成“政府采购合同回款账户确认单”，回传“山东省政府采购信息公开平台”推送至采购人。采购人应根据“确认单”信息，加强合同账户及资金支付管理，确保合同资金准确支付到贷款银行确认的回款账户，未经相关贷款金融机构同意不得随意变更。

九、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标或成交通知书；

（2）投标函及其附录；

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸（如果有）；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

十、承诺

扫描全能王

1.采购人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.供应商承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.采购人和供应商通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

十一、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

十二、签订时间

本合同于 2024.7.10 签订。

十三、签订地点

本合同在 枣庄市山亭区 签订。

十四、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十五、合同生效

本合同自 签字盖章之日 生效。

十六、合同份数

本合同一式伍份，均具有同等法律效力，采购人执叁份，供应商执贰份。

甲 方： 枣庄市山亭区交通运输局

单位名称(公章)

法定代表人或委托代理人：

(签字或盖章)

电 话：0632-8866112

乙 方： 枣庄市顺达公路工程有限公司

单位名称(公章)

法定代表人或委托代理人：

(签字或盖章)

电 话：0632-7555669

扫描全能王

山亭区2024年农村公路养护工程
评审控制价的审核报告

鲁山威造审字【2024】第064号

枣庄市山亭区财政局：

根据贵局的委托要求，我公司遵循“客观、公正、高效、准确”的服务宗旨，坚持“实事求是，客观公正，诚实信用”的原则，组织工程造价人员对山亭区2024年农村公路养护工程的预算进行审核，现将审核情况报告如下：

一、工程概况

本项目为山亭区2024年农村公路养护工程，主要内容包括：总则、路基、路面、安全设施及预埋管线、其他工程等工程内容。

二、审核范围

本审核报告山亭区2024年农村公路养护工程的预算进行项目审核。

三、审核依据

1、由建设单位提供工程量清单及其他相关资料

2、本地区相关的市场价格

3、《2013年山东省工程量清单项目计量规范》

4、2016年《山东省建筑工程消耗量定额》、2016年《山东省市政工程消耗量定额》

5、其他资料

四、审核原则

1、遵守现行的法律、法规、规章、规范性文件及行业规定要求，按相应的标准、规范技术文件执业。

2、实事求是，客观公正，诚实信用。

五、审核方法

依据送达资料，了解当地市场价格，采取全面审查法，对审核范围内的事项进行全面审查，对每一个数据进行逐项落实。

六、审核过程

1、了解工程概况，签订咨询合同。

2、收集所需资料。

3、核查各分部、分项工程量、单价、取费标准、材料价差。

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

4、形成咨询初步成果并征询有关各方的意见。

5、校对、复核咨询成果。

6、有关各方签字确认咨询结果。

七、审核结论

该工程预算送审总金额 3070748.16 元，审定总金 2383764.00 元。核减金额 686984.16 元。

八、声明

1、本咨询报告专为委托人所使用。未经本公司同意，不得向委托方、施工方和报告审查部门以外的单位和个人提供，本报告的全部或部分内容不得发表于任何公开媒体上。

2、委托单位提供资料的真实性、完整性由资料提供方负责，因资料失实造成审核结果出现偏差或失误，我公司及相关人员不承担相应责任。

3、本报告由山东山威项目管理有限公司负责解释。

附件：

1、项目预算评审定案表

2、审定预算书

单位公章：

编制人：

审核人：

2024年04月18日

申

经

扫描全能王

项目预算评审定案表

建设单位	枣庄市山亭区交通运输局	工程名称	山亭区2024年农村公路养护工程
申请评审日期	2024年04月15日	评审机构初审完成时间	2024年04月18日
咨 询 结 果			
送审工程造价（元）		3070748.16	
审定工程造价（元）		2383764.00	
净审减值（元）		686984.16	
其中：审增值（元）		-	
净审减值（%）		22.37%	
建设主管部门		财政部门	
枣庄市山亭区交通运输局（公章） 经办人： 年 月 日		枣庄市山亭区财政局（公章） 经办人： 年 月 日	注册造价师：（签章） 复核：（签章） 山东山昆项目管理有限公司（公章） 年 月 日

副本

山亭区2024年农村公路养护工程项目

投标文件

投标单位：枣庄市顺送公路工程有限公司

项目编号：SDGP370406000202402000057

2024 年 7 月 5 日

扫描全能王

投标函

枣庄市山亭区交通运输局：

枣庄市顺达公路工程有限公司系中华人民共和国合法企业，经营地址枣庄市山亭区新城府前东路4号。

我 马洪成 系枣庄市顺达公路工程有限公司的法定代表人，我方自愿参加贵方组织的山亭区山亭区2024年农村公路养护工程项目（项目编号:SDGP3704060002024020000057 ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审阅全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、若中标，我方将按照招标文件和投标文件的规定履行合同。

4、我方不是招标人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与招标人聘请的为此项目提供咨询服务的公司以及其附属机构没有任何关系。

5、投标文件自投标截止之日起投标有效期为 90 日历日。

以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果。

投标人全称（公章）：枣庄市顺达公路工程有限公司

法定代表人（签字或盖章）：

日期：2024年7月5日


扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

山亭区：实施农村公路市场化养护 按时检查及时整改排除道路安全隐患

2024-10-18 20:54:38 来源：鲁网 打印 手机看走



鲁网10月18日讯（记者 杜方奇 见习记者 刘承昊）10月18日，山亭区人民政府新闻办公室举行"聚焦民生福祉 打造幸福小城"主题系列新闻发布会第7场（山亭交通运输高质量发展专场）。山亭区山亭交通运输局党组成员、区农村公路事务中心主任满玉富就加强农村公路管养工作进行了详细介绍。

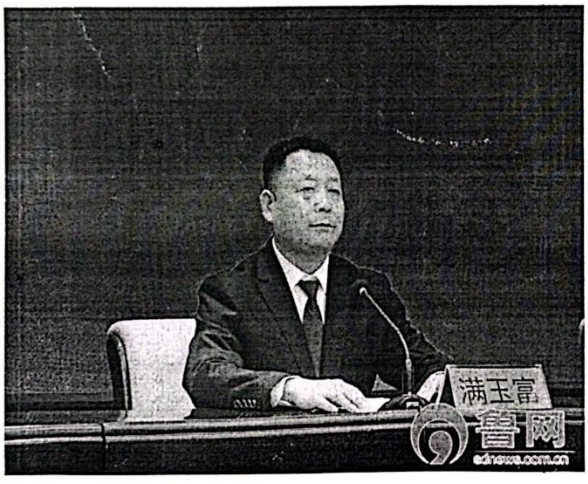

满玉富说，农村公路作为国省道路的补充，在便捷百姓出行和促进农村经济发展方面发挥着重要作用。目前，全区农村公路1500余公里，位居全市第二。

为了规范农村公路的管理养护，促进农村公路高质量、可持续健康发展，山亭区交通运输局不断探索农村公路管理养护的新模式、新途径，促进农村公路管养的正常化、专业化和规范化，为建设美丽乡村、服务乡村振兴贡献交通力量。

一是创新养护管理制度。成立路政中队，对镇街执法中队进行业务指导，加强路政巡查、严格路政执法；实施农村公路市场化养护，建立农村公路养护工作长效机制，确保农村公路养护工作取得实效。今年以来，挖补维修路面2300余

头条推荐 / 热点新闻

【重点】济南等60个城市今试点机动车行
【山东】玩转山东，跟新业态，也要新"
【财经】一图速览打造消费新场景"十七
【广饶】"特长生"如何培强，看广饶这
【热点】我国成功发射中星9A卫星
【评论】"city不city"的走红并非偶然

热点图片 /

精彩专题 /

热度推荐 /

100秒回顾深中通道7年建设关键节点 "从
弗洛伊德案之后 非洲裔再遭美国警察暴力
"city不city"的走红并非偶然
国际识局：过剩的不是产能，是西方的傲
专家驳"产能过剩论"：以邻为壑只会限
【世界说】外媒：美通胀高企冲击普通民
时政微观察丨总书记再提这一"新时尚"
【世界说】美国前驻外官员：美国应在内
新华时评丨说一套做一套无法取信于人一
【世界说】研究：受结构性种族主义影响，

平方米，安装修复护栏2840余米，施划标线1.7万余平方，补设标识标志59处，打造了农村公路山亭样板，为乡村振兴提供了支撑。

二是完善养护考核机制。每年初对农村公路制定养护计划，通过微信群检查、交管所日常巡查、农村公路事务中心随机抽查等"线上线下"、定期不定期的方式对道路管养情况进行实时监督，及时整改、排除道路安全隐患，并严格兑现奖惩。对农村公路路域环境综合整治实行按时检查、按期通报，确保农村公路管养效果。

三是完善内外沟通体系。坚持"互通有无、信息共享，相互合作、共同作战"的原则，强化农村公路事务中心与交通运输综合行政执法大队、公安交警部门的内外联系，在全市率先启动农村公路超限超载查处活动，加大隐患排查力度。今年以来，非现场监测点查处违章车辆162辆，提升了群众出行安全系数。

责任编辑：杜方奇

分享到：

新闻关键词：

枣庄市山亭区 肇作民生福址 新闻发布会

枣庄市山亭区采取多项举措 推动多部门持续进行不定期安全隐患检查 2024-12-22


枣庄市山亭区：践行发展好新时代"枫桥经验" 为辖区群众营造良好的社会治安环境 2024-12-22

山亭区：打通农村寄递物流堵点 全面构建县、乡、村三级农村物流网络体系 2024-10-18

枣庄市山亭区交运局：切实改善居住环境 提升群众出行体验 2024-10-18

山亭区交通运输局创新实施"信易+"工程 加快推动信用交通建设 2024-10-18

今日推荐 进入媒体矩阵



今天，让我们一起做红色精神的传承者

山东省重点项目和乡村振兴现场推进会举行

以进一步全面深化改革为动力

山东省委常委会召开会议

山东省委常委会会议暨省委党的建设工作领导小组会议召开

山东省十四届人大常委会第八次会议闭会

鲁网 sdnews.com.cn

关于我们 | 联系方式 | 广告服务 | 版权声明 |

新闻热线：0531-67753777 投稿邮箱：news@sdnews.com.cn

新闻许可：37120170003 出版物经营许可：新出发P223W22号 电信许可：鲁B2-20240534 ICP：鲁ICP备09023214号

主办：山东省新闻工作者协会

Copyright © 1997-2019 SDNews.com.cn All Rights Reserved.

统一社会信用代码

91370102MA3UHA4PX6

营业执照

（副 本） 5-1

扫描市场主体身份码了解更多登记、备案、许可、监管信息，体验更多应用服务。

名　　称　山东舜天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）

类　　型　特殊普通合伙企业

执行事务合伙人　肖东义

经营范围　许可项目：注册会计师业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：财政资金项目预算绩效评价服务；工程管理服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

出资额　叁佰陆拾万元整

成立日期　2020 年 12 月 03 日

主要经营场所　山东省济南市历下区华能路38号汇源大厦708室

登记机关　济南市历下区行政审批服务局

2023 年 05 月 09 日

国家企业信用信息公示系统网址：http://www.gsxt.gov.cn

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所

执业证书

名　　称：山东昇天信诚会计师事务所（特殊普通合伙）

首席合伙人：肖东义

主任会计师：

经营场所：山东省济南市历下区华能路38号汇源大厦706室

组织形式：特殊普通合伙

执业证书编号：37010041

批准执业文号：鲁财会协字[2001]28号

批准执业日期：2001年04月19日

证书序号：0015855

说　明

1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。

2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。

3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。

4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：[illegible]财政厅

二〇二一年[illegible]月[illegible]日

中华人民共和国财政部制
