

# 2025 年山亭区桑村镇贾庄村工程项目 事前绩效评估报告

项目名称： 2025 年山亭区桑村镇贾庄村工程项目

委托单位： 山亭区财政局

实施单位： 山亭区桑村镇人民政府

评估机构： 北京三维众智管理咨询有限公司

评估时间： 2025 年 5 月




## 报告撰写说明

本报告中的数据来自项目评估期间山亭区财政局提供的项目资料和其他官方渠道公开的信息，项目资料提供方对所提供资料的真实性、准确性负责。我公司秉承客观、公正、科学的原则，运用科学合理的工作思路和工作方法，在对 2025 年山亭区桑村镇贾庄村工程项目情况进行深入调研、勘查的基础上，按照现行预算绩效管理有关规定撰写本报告，报告内容真实完整、可追溯。

本报告以纸质印刷版和电子版向山亭区财政局报送。未经山亭区财政局书面允许，不得随意翻印、发布、扩散。

机构负责人： 

主 评 人： 

参 评 人：吕学永、徐亚南、闵 会、王业敏、石 灿

质量控制：一级审核：闵 会

二级审核：李 芳

三级审核：吕学永

# 目 录

摘 要 .....	I
事前绩效评估报告 .....	1
一、事前绩效评估对象 .....	1
（一）项目名称 .....	1
（二）项目单位 .....	1
（三）项目绩效目标 .....	1
（四）资金构成 .....	1
（五）项目基本情况 .....	1
二、事前绩效评估基本情况 .....	2
（一）评估程序 .....	2
（二）评估思路 .....	4
（三）评估方式方法 .....	6
三、事前绩效评估内容和结论 .....	7
（一）项目设立必要性 .....	7
（二）项目实施可行性 .....	8
（三）项目绩效目标合理性 .....	10
（四）项目经济性 .....	11
（五）项目资金合规性 .....	12
（六）总体结论 .....	13

四、存在问题 .....	15
五、相关建议 .....	16
六、其他需要说明的问题 .....	17

# 摘 要

## 一、项目基本情况

### （一）立项背景及实施目的

贾庄村位于桑村镇的东北部，户籍人口 3,000 余人，村内部道路未硬化，雨后泥泞，给村民日常出行带来不便，影响了村民的生产生活和村庄的整体形象。为改善村民的出行条件，提升村庄基础设施水平，桑村镇人民政府计划对贾庄村内部分路段进行路面硬化，推动城乡协调发展。

### （二）资金构成

项目总概算 96 万元，计划全额申请农村公益事业财政奖补资金。

### （三）项目绩效目标

通过项目实施，计划硬化村内道路 8,000 平方米，方便村民出行，提高生产生活效率，增强村民的幸福感和满意度。

## 二、评估工作开展情况

本次绩效评估工作包括前期准备、组织实施、报告撰写三个阶段，具体实施时间为 2025 年 4 月 21 日—5 月 20 日。

### （一）前期准备（4 月 21 日—4 月 25 日）

4 月 21 日，评估机构及业务专家、财务专家等组成评估工

作组，按照《关于印发〈枣庄市山亭区区级政策和项目预算事前绩效评估工作规程〉的通知》（山财绩〔2020〕10号）要求，拟定工作方案，明确评估内容、方法、程序等。4月25日向涉及镇（街）下达评估通知，明确资料清单、评估程序、评估要求。

### （二）组织实施（4月26日—5月10日）

收集项目资料。对项目负责人进行初步访谈，按照资料清单收集并整理项目资料。

现场调研。评估工作组通过现场勘查、查阅资料、集中座谈等方式，多渠道获取项目信息。

召开专家评估会。评估专家通过审核资料、听取项目单位汇报，对项目进行评估，重点对财政资金支持的必要性和可行性进行论证。在此基础上，评估专家独立出具《事前绩效评估专家意见书》。

### （三）报告撰写（5月11日—5月20日）

评估工作组汇总、分析评估专家意见，按照规定的文本格式和要求，撰写事前绩效评估报告，于5月20日前向委托方提交事前绩效评估报告，接受绩效评估结果的集中评审。

## 三、评估结论

经评估，2025年山亭区桑村镇贾庄村工程项目事前绩效评估得分87分，评估结论为：**建议予以支持**。建议项目资金总额核减8.92万元，支持87.08万元。具体评估结论如下：

### 1.项目设立必要性

该指标分值 25 分，评估得分 25 分，得分率 100%。

该项目依据中央、省级关于农村综合改革试点相关文件设立，立项依据较充分，符合中央转移支付资金支持方向，符合事权与支出责任相适应原则，与桑村镇人民政府职能相关，实施内容能够解决贾庄村村民出行不便的问题，促进乡村发展、乡村建设、乡村治理，项目现实需求必要性强。

### 2.项目实施可行性

该指标分值 25 分，评估得分 22 分，得分率 88%。

项目经贾庄村“两委”会议集体表决、桑村镇党委专题会议研究审议后批准实施，立项程序规范。实施方案中建设内容较明确，但在前期调研、可行性分析、工程规划设计与布局以及施工技术方案等方面不够明确和细化，部分风险未制定有效的应对措施，方案有待完善。

### 3.项目绩效目标合理性

该指标分值 15 分，评估得分 12 分，得分率 80%。

项目预期产出与效益明确，但部分绩效指标设置不合理，与项目相关性不强，未聚焦道路硬化核心任务，且质量指标未明确工程质量标准；效益指标多为定性指标，可考核性不强。

### 4.项目经济性

该指标分值 15 分，评估得分 10 分，得分率 66.67%。

项目采取公开招标的方式采购，成本控制措施较好，但部分工程未编制详细的工程量清单，工程报价虚高。评估工作组建议核减 8.92 万元，支持 87.08 万元。

#### 5.项目资金合规性

该指标分值 20 分，评估得分 18 分，得分率 90%。

项目拟申请中央转移支付资金，符合农村公益事业建设财政奖补资金支持方向，来源合规，筹资风险低，但截至评估日资金使用进度尚不明确，资金使用合理性有待进一步论证。

### 四、存在问题

#### （一）项目投入不够经济、合理

部分工程报价虚高，如路床（槽）整形费用较市场价格高出 757.14%，工程总报价较市场价格高出 10.24%，资金投入不够经济、合理。

#### （二）项目实施方案和风险应对措施不够完善

一是实施方案明确了项目建设内容、保障措施等内容，但在前期调研、可行性分析、工程规划设计与布局以及施工技术方案等方面不够明确和细化，未体现项目资金使用进度，实施方案有待完善。

二是实施过程中存在自然、施工、资金等不确定因素和风险，但部分风险未制定有效的应对措施。



### （三）部分绩效指标设置不合理

一是部分指标与项目建设内容不相关，如数量指标“开展红色美丽村庄试点村数”“开展农村综合性改革试点试验个数”。

二是质量指标设置为“基础设施进一步优化”“服务设施进一步完善”“乡村振兴蓬勃发展”，未体现工程要求达到的质量标准。

三是效益指标多为定性指标，可考核性不强。

## 五、相关建议

### （一）加强项目论证，提高资金投入经济性

建议项目单位进一步对各分项工程的市场价格进行调研，充分了解材料、人工、机械等成本，详细编制工程量清单，确保资金投入的合理性和经济性。同时，合理制定招标控制价格，降低工程成本，提高资金的使用效益。

### （二）完善项目实施方案，健全风险预警与应对机制

一是结合项目实际，完善工程规划设计与布局、施工技术方案等内容，明确施工方法、工艺流程、施工部署等，提高实施方案的科学性和可操作性。同时，制定详细的资金使用进度方案，明确各阶段使用计划和目标，便于对资金的动态监控和管理。

二是针对项目实施过程中可能存在的自然、施工、资金等不确定因素和风险，建立健全风险预警机制，制定有效的应对措施，提高项目的抗风险能力。此外，建议成立由镇政府、村委会、村

民代表共同参与的质量监督小组，聘请第三方专业监理单位，形成“内部监督+外部监理”双重保障，确保项目顺利实施。

### （三）完善绩效目标申报表，提高绩效指标的合理性

一是全面梳理绩效目标，删除“开展红色美丽村庄试点村数”“开展农村综合性改革试点试验个数”等与项目实施内容不相关的指标，设置道路硬化长度、面积等指标，提高指标的合理性。

二是量化质量指标，设置“路面平整度误差 $\leq 8\text{mm}$ ”“项目一次性验收合格率”等定量或可衡量的具体标准，增强指标的考核性。

三是建议删除与项目相关性不强的经济效益指标，生态效益设置为“改善村民生产生活环境”，社会效益设置为“项目直接惠及村民人数”等指标，以便更准确地评估项目效益。

# 事前绩效评估报告

## 一、事前绩效评估对象

### （一）项目名称

2025 年山亭区桑村镇贾庄村工程项目。

### （二）项目单位

该项目主管部门为山亭区财政局（以下简称区财政局），实施单位山亭区桑村镇人民政府。

### （三）项目绩效目标

通过项目实施，计划硬化村内道路 8,000 平方米，方便村民出行，提高生产生活效率，增强村民的幸福感和满意度。

### （四）资金构成

项目总概算 96 万元，计划全额申请农村公益事业财政奖补资金。

### （五）项目基本情况

#### 1. 立项背景

贾庄村位于桑村镇的东北部，户籍人口 3,000 余人，村内部道路未硬化，雨后泥泞，给村民日常出行带来不便，影响了村民的生产生活和村庄的整体形象。为改善村民的出行条件，提升村庄基础设施水平，桑村镇人民政府计划对贾庄村内部分路段进行路面硬化，推动城乡协调发展。

## 2.组织机构及职责分工

(1) 区财政局为主管部门，负责项目预算申请、资金分配、绩效目标编制、事前评估、绩效监控、绩效评价等；负责审核项目实施方案，对采购过程进行监管；及时发现和协调解决实施过程中的问题。

(2) 桑村镇人民政府为实施单位，负责拟定建设计划，组织民主决议，编制项目工程量清单，对预算资金进行测算，委托代理机构开展政府采购，组织实施，工程完工后组织验收，负责保养维护等日常管理。

## 二、事前绩效评估基本情况

### (一) 评估程序

为确保事前绩效评估工作客观公正，本次评估工作遵守严格、规范的工作程序，包括前期准备、组织实施、报告撰写三个阶段，具体实施时间为 2025 年 4 月 21 日—5 月 20 日。

#### 1.前期准备（4 月 21 日—4 月 25 日）

(1) 组建评估工作组。北京三维众智管理咨询有限责任公司（以下简称评估机构）受区财政局委托，于 4 月 21 日组建评估工作组。具体人员分工见表 1。

表 1：人员安排及分工情况表

姓 名	职称/职务	任务分工
李 芳	中级会计师 中级经济师	项目负责人，对项目总体调度、协调和沟通，参与绩效评估方案及指标体系的制定，对整体工作质量把关
闵 会	助理会计师	参与现场调研，资料统计、分析，辅助撰写调研报告

姓 名	职称/职务	任务分工
陈家晴	助理会计师	参与现场调研，资料统计、分析，辅助撰写调研报告
吕学永	注册价格鉴证师 中级经济师	技术质量专员，对报告撰写及最终成果进行质量把控
王业敏	造价工程师	外聘业务专家，参与绩效评估方案及指标体系的制定，参与现场调研，综合评定打分，提出意见或建议
石 灿	建造师	外聘业务专家，参与绩效评估方案及指标体系的制定，参与现场调研，综合评定打分，提出意见或建议

（2）拟定工作方案。评估工作组严格按照《关于印发〈枣庄市山亭区区级政策和项目预算事前绩效评估工作规程〉的通知》（山财绩〔2020〕10号）要求，拟定工作方案，明确评估内容、方法、程序等，提交委托方征求意见，并修改完善。

（3）下达评估通知书。4月25日向涉及镇（街）下达评估通知，明确资料清单、评估程序、评估要求。

## 2.组织实施（4月26日—5月10日）

（1）收集项目资料。对项目负责人进行初步访谈，按照资料清单收集并整理项目资料，为现场调研做好准备。

（2）现场调研。评估工作组通过现场勘查、查阅资料、集中座谈等方式，多渠道获取政策信息，同时要求项目单位补充完善评估资料。

（3）召开专家评估会。评估专家通过审核资料、听取项目单位汇报，对项目的相关性、可实现性、可持续性、实施方案的有效性、资金投入的可行性及风险管控等内容进行评估，重点对财政资金支持的必要性和可行性进行论证。在此基础上，评估专

家独立出具《事前绩效评估专家意见书》。


### 3.报告撰写（5月11日—5月20日）

（1）撰写评估报告。评估工作组汇总评估资料，结合评估专家意见，按照规定的文本格式和要求，撰写事前绩效评估报告；同时，整理评估资料，归档备查。

（2）提交评估报告。评估工作组于5月20日前向委托方提交事前绩效评估报告，接受绩效评估结果的集中评审。

#### （二）评估思路

根据《关于印发〈枣庄市山亭区区级政策和项目预算事前绩效评估工作规程〉的通知》（山财绩〔2020〕10号），结合《山东省省级政策和项目预算事前绩效评估管理办法（讨论稿）》的规定，围绕项目设立必要性、实施可行性、绩效目标合理性、经济性、资金合规性等评估重点，对财政是否支持进行充分评估，评估思路详见图1。

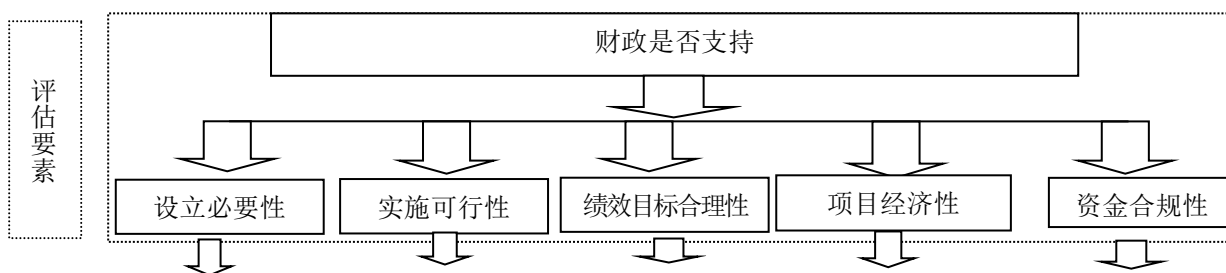

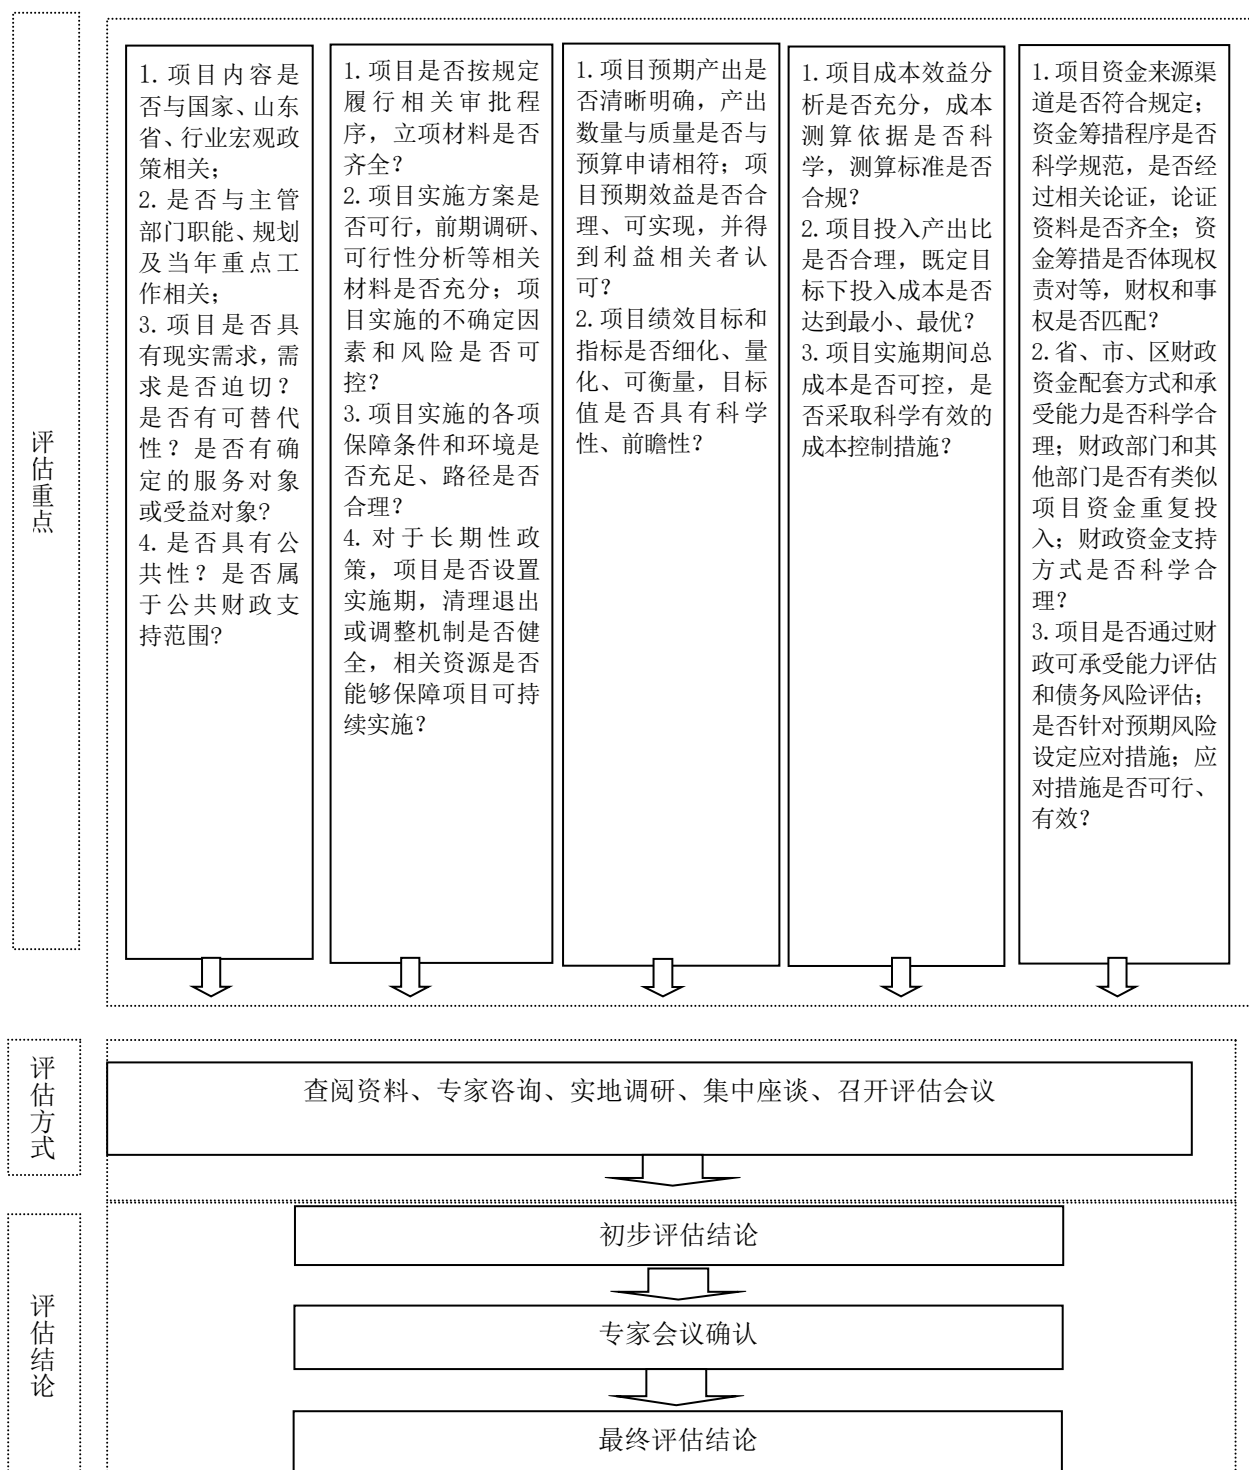


图 1：项目事前绩效评估思路

### （三）评估方式方法

#### 1.评估原则

根据《关于印发〈枣庄市山亭区区级政策和项目预算事前绩效评估工作规程〉的通知》（山财绩〔2020〕10号）要求，按照科学规范、公开公正、绩效相关、政策相符、依据充分、独立评估等原则开展绩效评估。

#### 2.评估方式、方法

##### （1）评估方式

主要采用专家咨询、现场调研、召开座谈会等方式。

##### （2）评估方法

评估机构采用成本效益分析法、比较法、因素分析法等方法进行绩效评估。评估专家采用集中评议和独立评分相结合的方法进行评估。根据各专家的评分，计算出各项指标的平均分值，然后汇总得出项目综合得分，形成评估结论。

#### 3.评估标准

根据《关于印发〈枣庄市山亭区区级政策和项目预算事前绩效评估工作规程〉的通知》（山财绩〔2020〕10号）规定，评估结果包括评估得分和评估结论两部分。总分设置为100分，评估结论分为“建议予以支持、建议调整完善后予以支持、建议不予支持”三种。



### 三、事前绩效评估内容和结论

#### （一）项目设立必要性

该指标分值 25 分，评估得分 25 分，得分率 100%。得分情况见表 2。

表 2：项目设立必要性指标得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
项目设立必要性	25.00	25.00	100.00%
依据充分性	5.00	5.00	100.00%
需求必要性	10.00	10.00	100.00%
职能相关性	5.00	5.00	100.00%
财政投入相关性	5.00	5.00	100.00%

#### 1.依据充分性

该指标分值 5 分，评估得分 5 分，得分率 100%。

该项目为山亭区 2025 年农村公益事业建设项目之一，符合《财政部关于印发〈农村综合改革转移支付管理办法〉的通知》（财农〔2021〕36 号）、《山东省财政厅关于印发〈山东省农村综合改革发展资金管理办法〉的通知》（鲁财农〔2024〕17 号）等文件要求，旨在硬化村内道路，改善村民出行条件，提高村民幸福感和满意度，立项依据较充分。

#### 2.需求必要性

该指标分值 10 分，评估得分 10 分，得分率 100%。

评估工作组对贾庄村进行了现场调研，村内道路多为泥土路面，是村民日常出行和农业生产活动的重要通道，路面坑洼不平，雨后泥泞，实施内容得到了村民代表的一致支持，项目实施必要性强。

3.职能相关性

该指标分值 5 分，评估得分 5 分，得分率 100%。

该项目与桑村镇人民政府“落实‘三农’政策，承担农村改革发展、乡村振兴和新农村建设等工作”职能相关。

4.财政投入相关性

该指标分值 5 分，评估得分 5 分，得分率 100%。

项目实施内容为村内道路硬化，符合《山东省财政厅关于印发〈山东省农村综合改革发展资金管理办法〉的通知》（鲁财农〔2024〕17号）中“农村公益事业建设财政奖补资金”支持方向，属于公共财政支持范围，符合事权与支出责任相适应原则。

（二）项目实施可行性

该指标分值 25 分，评估得分 22 分，得分率 88%。得分情况见表 3。

表 3：项目实施可行性指标得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
项目实施可行性	25.00	22.00	88.00%
程序合规性	5.00	5.00	100.00%
方案可行性	10.00	8.00	80.00%

指 标	分 值	得 分	得分率
条件充足性	5.00	4.00	80.00%
实施持续性	5.00	5.00	100.00%

### 1.程序合规性

该指标分值 5 分，评估得分 5 分，得分率 100%。

2025 年 2 月 28 日，桑村镇贾庄村召开“两委”会议，经集体讨论，提议并表决通过村内道路修复事宜。4 月 12 日，桑村镇党委召开专题会议，对该项目进行研究审议，最终批准实施。

### 2.方案可行性

该指标分值 10 分，评估得分 8 分，得分率 80%。

实施方案具备一定可行性，但在前期调研、可行性分析及工程规划设计与布局，施工技术方案等方面不够明确和细化。实施过程中存在自然、施工、资金等不确定因素和风险，对部分风险点未制定有效的应对措施，方案有待完善。

### 3.条件充足性

该指标分值 5 分，评估得分 4 分，得分率 80%。

该项目编制了详细的工程量清单，但未提供设计图纸，工程设计手续不完备，实施条件尚不具备。

### 4.实施持续性

该指标分值 5 分，评估得分 5 分，得分率 100%。

村内道路设计使用年限在 10 年以上，工程完工后移交至项

目村管理，负责日常检查维修，能够确保项目持续发挥成效。

### （三）项目绩效目标合理性

该指标分值 15 分，评估得分 12 分，得分率 80%。得分情况见表 4。

表 4：项目绩效目标合理性指标得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
项目绩效目标合理性	15.00	12.00	80.00%
预期合理性	10.00	10.00	100.00%
目标合理性	5.00	2.00	40.00%

#### 1.预期合理性

该指标分值 10 分，评估得分 10 分，得分率 100%。

该项目预期产出和受益对象较明确。通过道路硬化，能够提升贾庄村整体面貌和基础设施水平，方便村民出行，增强村民的幸福感和获得感，促进乡村可持续发展，预期效益较合理。

#### 2.目标合理性

该指标分值 5 分，评估得分 2 分，得分率 40%。

部分绩效指标设置不合理。

（1）部分指标与项目建设内容不相关，如数量指标“开展红色美丽村庄试点村数”“开展农村综合性改革试点试验个数”；

（2）质量指标设置为“基础设施进一步优化”“服务设施进一步完善”“乡村振兴蓬勃发展”，未体现工程要求达到的质

量标准;

(3) 效益指标多为定性指标, 不便于考核。

#### (四) 项目经济性

该指标分值 15 分, 评估得分 10 分, 得分率 66.67%。得分情况见表 5。

表 5: 项目经济性指标得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
项目经济性	15.00	10.00	66.67%
成本经济性	5.00	2.00	40.00%
成本效益性	5.00	3.00	60.00%
成本可控性	5.00	5.00	100.00%

##### 1.成本经济性

该指标分值 5 分, 评估得分 2 分, 得分率 40%。

评估工作组对各项工程进行了询价、测算, 并与申报资金进行了比对, 发现部分工程报价虚高, 如路床(槽)整形费用较市场价格高出 757.14%, 资金投入不够经济、合理, 评估工作组建议核减 8.92 万元, 核减后项目总预算 87.08 万元, 资金核减情况详见附件 4。

##### 2.成本效益性

该指标分值 5 分, 评估得分 3 分, 得分率 60%。

部分建设内容报价虚高, 投入成本未达到最小、最优, 成本

效益性有待提高。

### 3.成本可控性

该指标分值 5 分，评估得分 5 分，得分率 100%。

项目执行政府采购相关制度，通过公开招标程序进行采购，成本控制措施较好，但须制定合理的招标控制价格，确保投入的经济性。

### （五）项目资金合规性

该指标分值 20 分，评估得分 18 分，得分率 90%。得分情况见表 6。

表 6：项目资金合规性指标得分表

指 标	分 值	得 分	得分率
项目资金合规性	20.00	18.00	90.00%
筹资合规性	5.00	5.00	100.00%
使用合理性	5.00	3.00	60.00%
风险可控性	10.00	10.00	100.00%

### 1.筹资合规性

该指标分值 5 分，评估得分 5 分，得分率 100%。

项目拟申请中央转移支付资金，符合《财政部关于印发〈农村综合改革转移支付管理办法〉的通知》（财农〔2021〕36 号）中规定的资金支持方向，来源渠道合规。

## 2.使用合理性

该指标分值 5 分，评估得分 3 分，得分率 60%。

项目资金拟根据采购合同约定的付款方式拨付，截至评估工作日尚未明确项目资金使用进度，资金使用合理性有待论证。

## 3.风险可控性

该指标分值 10 分，评估得分 10 分，得分率 100%。

项目资金为中央转移支付资金，由中央财政承担，筹资风险较低、可控。

## （六）总体结论

经评估，2025 年山亭区桑村镇贾庄村工程项目事前绩效评估得分 87 分，评估结论为：**建议予以支持**。建议项目资金总额核减 8.92 万元，支持 87.08 万元。具体评估结论如下：

### 1.项目设立必要性

该指标分值 25 分，评估得分 25 分，得分率 100%。

该项目依据中央、省级关于农村综合改革试点相关文件设立，立项依据较充分，符合中央转移支付资金支持方向，符合事权与支出责任相适应原则，与桑村镇人民政府职能相关，实施内容能够解决贾庄村村民出行不便的问题，促进乡村发展、乡村建设、乡村治理，项目现实需求必要性强。

### 2.项目实施可行性

该指标分值 25 分，评估得分 22 分，得分率 88%。

项目经贾庄村“两委”会议集体表决、桑村镇党委专题会议研究审议后批准实施，立项程序规范。实施方案中建设内容较明确，但在前期调研、可行性分析、工程规划设计与布局以及施工技术方案等方面不够明确和细化，部分风险未制定有效的应对措施，方案有待完善。

### 3.项目绩效目标合理性

该指标分值 15 分，评估得分 12 分，得分率 80%。

项目预期产出与效益明确，但部分绩效指标设置不合理，与项目相关性不强，未聚焦道路硬化核心任务，且质量指标未明确工程质量标准；效益指标多为定性指标，可考核性不强。

### 4.项目经济性

该指标分值 15 分，评估得分 10 分，得分率 66.67%。

项目采取公开招标的方式采购，成本控制措施较好，但部分工程未编制详细的工程量清单，工程报价虚高。评估工作组建议核减 8.92 万元，支持 87.08 万元。

### 5.项目资金合规性

该指标分值 20 分，评估得分 18 分，得分率 90%。

项目拟申请中央转移支付资金，符合农村公益事业建设财政奖补资金支持方向，来源合规，筹资风险低，但截至评估日资金使用进度尚不明确，资金使用合理性有待进一步论证。



## 四、存在问题

### （一）项目投入不够经济、合理

部分工程报价虚高，如路床（槽）整形费用较市场价格高出 757.14%，工程总报价较市场价格高出 10.24%，资金投入不够经济、合理。

### （二）项目实施方案和风险应对措施不够完善

一是实施方案明确了项目建设内容、保障措施等内容，但在前期调研、可行性分析、工程规划设计与布局以及施工技术方案等方面不够明确和细化，未体现项目资金使用进度，实施方案有待完善。

二是实施过程中存在自然、施工、资金等不确定因素和风险，但部分风险未制定有效的应对措施。

### （三）部分绩效指标设置不合理

一是部分指标与项目建设内容不相关，如数量指标“开展红色美丽村庄试点村数”“开展农村综合性改革试点试验个数”。

二是质量指标设置为“基础设施进一步优化”“服务设施进一步完善”“乡村振兴蓬勃发展”，未体现工程要求达到的质量标准。

三是效益指标多为定性指标，可考核性不强。

## 五、相关建议

### （一）加强项目论证，提高资金投入经济性

建议项目单位进一步对各分项工程的市场价格进行调研，充分了解材料、人工、机械等成本，详细编制工程量清单，确保资金投入的合理性和经济性。同时，合理制定招标控制价格，降低工程成本，提高资金的使用效益。

### （二）完善项目实施方案，健全风险预警与应对机制

一是结合项目实际，完善工程规划设计与布局、施工技术方案等内容，明确施工方法、工艺流程、施工部署等，提高实施方案的科学性和可操作性。同时，制定详细的资金使用进度方案，明确各阶段使用计划 and 目标，便于对资金的动态监控和管理。

二是针对项目实施过程中可能存在的自然、施工、资金等不确定因素和风险，建立健全风险预警机制，制定有效的应对措施，提高项目的抗风险能力。此外，建议成立由镇政府、村委会、村民代表共同参与的质量监督小组，聘请第三方专业监理单位，形成“内部监督+外部监理”双重保障，确保项目顺利实施。

### （三）完善绩效目标申报表，提高绩效指标的合理性

一是全面梳理绩效目标，删除“开展红色美丽村庄试点村数”“开展农村综合性改革试点试验个数”等与项目实施内容不相关的指标，设置道路硬化长度、面积等指标，提高指标的合理性。

二是量化质量指标，设置“路面平整度误差 $\leq 8\text{mm}$ ”“项目

一次性验收合格率”等定量或可衡量的具体标准，增强指标的可考核性。

三是建议删除与项目相关性不强的经济效益指标，生态效益设置为“改善村民生产生活环境”，社会效益设置为“项目直接惠及村民人数”等指标，以便更准确地评估项目效益。

## 六、其他需要说明的问题

（一）本次评估以项目单位提供的评估材料为基础。

（二）本报告仅为委托方提供参考依据，不作其他用途。

（三）建议将事前评估结果在一定范围内公布，为主管部门及预算单位改进工作、调整和优化本部门预算支出结构、合理配置资源提供借鉴。

附件：1.2025 年山亭区桑村镇贾庄村工程项目事前绩效评估  
评分指标和得分表

2.评估工作组情况表

3.事前绩效评估专家意见书

4.项目预算审核表

附件 1

2025 年山亭区桑村镇贾庄村工程项目事前绩效评估评分指标和得分表

一级指标	二级指标	评估要点	备 注	指标得分	扣分理由
项目设立 必要性	依据充分性 (5 分)	①项目设立是否与国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划、国家行业规划及我省经济和社会发展规划相符	为否定性指标， 二级指标得分率 80%（含）以下， 即 20 分（含）以下， 则结论为不 予支持	5.00	——
	需求必要性 (10 分)	②项目设立是否具有现实需求、需求是否迫切、是所要解决问题的必要条件； ③项目设立是否与其他项目存在交叉重叠		10.00	——
	职能相关性 (5 分)	④项目设立是否符合政策制定或实施主体职能定位		5.00	——
	财政投入相关性 (5 分)	⑤项目设立是否属于公共财政支持范围，是否符合事权与支出责任相适应原则； ⑥产业类政策和项目是否符合公平竞争要求		5.00	——

一级指标	二级指标	评估要点	备 注	指标得分	扣分理由
项目实施可行性	程序合规性 (5 分)	①项目是否按规定履行相关审批程序，立项相关材料是否齐全	为否定性指标， 二级指标得分率 80%（含）以下， 即 20 分（含）以下， 则结论为不予支持	5.00	——
	方案可行性 (10 分)	②项目实施方案是否可行，前期调研、可行性分析等相关材料是否充分； ③项目实施的不确定因素和风险是否可控		8.00	实施方案具备一定可行性，但在前期调研、可行性分析及工程规划设计与布局，施工技术方案等方面不够明确和细化。实施过程中存在自然、施工、资金等不确定因素和风险，对部分风险点未制定有效的应对措施，方案有待完善
	条件充足性 (5 分)	④项目实施的各项保障条件和环境是否充足、路径是否合理		4.00	该项目编制了详细的工程量清单，但未提供设计图纸，工程设计手续不完备，实施条件尚不具备
	实施持续性 (5 分)	⑤对于长期性政策，项目是否设置实行期，清理退出或调整机制是否健全，相关资源是否能够保障项目可持续实施		5.00	——
项目绩效目标合理性	预期合理性 (10 分)	①项目预期产出是否清晰明确，产出数量与质量是否与预算申请相符； ②项目预期效益是否合理、可实现，并得到利益相关者认可	——	10.00	——
	目标合理性 (5 分)	③项目绩效目标和指标是否细化、量化、可衡量，目标值是否具有科学性、前瞻性	——	2.00	部分绩效指标设置不合理。一是部分指标与项目建设内容不相关，如数量指标“开展红色美丽村庄试点村数”“开展农村综合性改革试点试验个数”；二是质量指标设置为“基础设施进一步优化”“服务设施进一步完善”“乡村振兴蓬勃发展”，未体现工程要求达到的质量标准；三是效益指标多为定性指标，不便于考核

一级指标	二级指标	评估要点	备 注	指标得分	扣分理由
项目经济性	成本经济性 (5 分)	①项目成本效益分析是否充分，成本测算依据是否科学，测算标准是否合理	---	2.00	评估工作组对各项工程进行了询价、测算，并与申报资金进行了比对，发现部分工程报价虚高，如路床（槽）整形费用较市场价格高出 757.14%，资金投入不够经济、合理，评估工作组建议核减 8.92 万元，核减后项目总预算 87.08 万元
	成本效益性 (5 分)	②项目投入产出比是否合理，既定目标下投入成本是否达到最小、最优	---	3.00	部分建设内容报价虚高，投入成本未达到最小、最优，成本效益性有待提高
	成本可控性 (5 分)	③项目实施期间总成本是否可控，是否采取科学有效的成本控制措施	---	5.00	---
项目资金合规性	筹资合规性 (5 分)	①项目资金筹集是否规范合理	---	5.00	---
	使用合理性 (5 分)	②项目各级财政分摊方式和比例是否科学、资金使用进度是否明确合理	---	3.00	项目资金拟根据采购合同约定的付款方式拨付，截至评估工作日尚未明确项目资金使用进度，资金使用合理性有待论证
	风险可控性 (10 分)	③项目是否通过财政可承受能力评估和债务风险评估； ④项目是否针对预计出现的筹资风险制定有效应对措施	---	10.00	---
合计得分				87.00	建议予以支持

附件 2

评估工作组情况表

姓 名	职称/职务	签字
李 芳	中级会计师 中级经济师	李芳
闵 会	助理会计师	闵会
陈家晴	项目助理	陈家晴
吕学永	注册价格鉴证师 中级经济师	吕学永
王业敏	造价工程师	王业敏
石 灿	建造师	石灿

附件 3

## 事前绩效评估专家意见书

项目名称： 2025 年山亭区桑村镇贾庄村工程

委托单位： 山亭区财政局

评估机构： 北京三维众智管理咨询有限责任公司

评估时间： 2025 年 5 月



事前绩效评估专家组评估意见

评估指标及分值		专家评估计分					
评估指标	分值	专家 1	专家 2	专家 3	专家 4	专家 5	平均
设立必要性	25	25	25	25	25	25	25
依据充分性	5	5	5	5	5	5	5
需求必要性	10	10	10	10	10	10	10
职能相关性	5	5	5	5	5	5	5
财政投入相关性	5	5	5	5	5	5	5
实施可行性	25	22	22	21	23	22	22
程序合规性	5	5	5	5	5	5	5
方案可行性	10	8	9	8	8	7	8
条件充足性	5	4	3	3	5	5	4
实施持续性	5	5	5	5	5	5	5
绩效目标合理性	15	12	12.5	12	12	11.5	12
预期合理性	10	10	10	10	10	10	10
目标合理性	5	2	2.5	2	2	1.5	2
经济性	15	10	9.5	10	9	11.5	10
成本经济性	5	2	1.5	2	2	2.5	2
成本效益性	5	3	3	3	2	4	3
成本可控性	5	5	5	5	5	5	5
资金合规性	20	18	18	18	17	19	18
筹资合规性	5	5	5	5	5	5	5
使用合理性	5	3	3	3	2	4	3
风险可控性	10	10	10	10	10	10	10

合计	100	87	87	86	86	89	87
评估得分	87						
评估结论	建议予以支持 <input checked="" type="checkbox"/> 建议调整完善后予以支持 <input type="checkbox"/> 不予支持 <input type="checkbox"/>						
<div>分项意见：</div> <div>1.项目设立必要性 该项目依据中央、省级关于农村综合改革试点相关文件设立，立项依据较充分，符合中央转移支付资金支持方向，符合事权与支出责任相适应原则，与桑村镇人民政府职能相关，实施内容能够解决贾庄村村民出行不便的问题，促进乡村发展、乡村建设、乡村治理，项目现实需求必要性强。</div> <div>2.项目实施可行性 项目经贾庄村“两委”会议集体表决、桑村镇党委专题会议研究审议后批准实施，立项程序规范。实施方案中建设内容较明确，但在前期调研、可行性分析、工程规划设计与布局以及施工技术方案等方面不够明确和细化，部分风险未制定有效的应对措施，方案有待完善。</div> <div>3.项目绩效目标合理性 项目预期产出与效益明确，但部分绩效指标设置不合理，与项目相关性不强，未聚焦道路硬化核心任务，且质量指标未明确工程质量标准；效益指标多为定性指标，可考核性不强。</div> <div>4.项目经济性 项目采取公开招标的方式采购，成本控制措施较好，但部分工程未编制详细的工程量清单，工程报价虚高。评估工作组建议核减 8.92 万元，支持 87.08 万元。</div> <div>5.项目资金合规性 项目拟申请中央转移支付资金，符合农村公益事业建设财政奖补资金支持方向，来源合规，筹资风险低，但截至评估日资金使用进度尚不明确，资金使用合理性有待进一步论证。</div> <div>总体意见： 经评估，2024 年山亭区桑村镇贾庄村工程项目事前绩效评估得分 87 分，评估结论为：建议予以支持。</div> <div>其他问题和建议： (一) 加强项目论证，提高资金投入经济性 (二) 完善项目实施方案，健全风险预警与应对机制 (三) 完善绩效目标申报表，提高绩效指标的合理性</div> <div>专家组组长签字：李芳</div> <div>日期：2025 年 5 月 10 日</div>							

附件 4

项目预算审核表

单位：万元

序 号	项目名称	主要建设内容	概算投资	支持金额	核减金额	高于市场价比例
1	路床(槽) 整形	路床(槽) 整形 8000 m²	12.00	1.40	10.60	757.14%
2	现浇混凝土路面	水泥混凝土 8000 m²; 1. 混凝土强度等级:18cm 厚 C25 混凝土路面	84.00	85.68	-1.68	-1.96%
合 计			96.00	87.08	8.92	10.24%
